

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATO DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO, PROGRAMACIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO POR LA **MTRA. KARLA GABRIELA PERAZA ZAZUETA** EN SU CARÁCTER DE CONSEJERA PRESIDENTA Y EL **LIC. ARTURO FAJARDO MEJÍA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA **INFORMATICA ELECTORAL, SC** REPRESENTADA POR **JESÚS OSCAR CRESPO PALAZUELOS** EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

OBJETO DEL CONTRATO

ÚNICO.- Es objeto del presente contrato la contratación del servicio para el diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA.

DECLARACIONES

1.- DE "EL INSTITUTO":

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como el artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en cuya integración concurren los partidos políticos y los ciudadanos. En el ejercicio de sus funciones serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

1.2 Que tiene su domicilio oficial y fiscal en: Paseo Niños Héroes No. 352 Int. 2, Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, mismo que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.

1.3 Que la Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta, acredita su personalidad mediante el acuerdo INE/CG811/2015, a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la designa Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Sinaloa.

1.4 Que la Consejera Presidenta de "EL INSTITUTO" celebra el presente contrato en ejercicio de las atribuciones que legalmente le están conferidas, de conformidad con el artículo 148, párrafo primero, fracciones XIV y XV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

1.5 Que es un organismo dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local.

1.6 Que acredita su existencia legal con base en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial de gobierno del Estado de Sinaloa, No. 156, de fecha 11 de diciembre de dos mil diecisiete.

1.7 Que el Lic. Arturo Fajardo Mejía, acredita el carácter de Secretario Ejecutivo, a través de la designación efectuada por el Consejo General del "EL INSTITUTO", en sesión extraordinaria de fecha nueve de septiembre de dos mil quince mediante acuerdo IEES/CG/001/15; por lo que, de conformidad con el artículo 149, fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa lo faculta para firmar en conjunto con la Presidencia.

1.8 Que el presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento adquisitivo de Adjudicación Directa relativo a la contratación del servicio para el diseño, programación, instalación, implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local 2020-2021 del estado de Sinaloa efectuado por el "EL INSTITUTO" a través de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, observando, entre otros, los términos y condiciones estipuladas en el artículo 338, numerales 4, 5 y 6 del Reglamento de Elecciones.

1.9 Que requiere de la prestación de servicios de la empresa **INFORMÁTICA ELECTORAL, SC** para el diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA.

1.10 Que cuenta con el presupuesto para cubrir los servicios de diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA, mismo que proviene de recursos federales no etiquetados, autorizados en la partida 3000, relativa a Servicios Generales.

1.11 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **IEE150716TH8**.

2.- DE "EL PROVEEDOR":

2.1 Que la empresa **INFORMÁTICA ELECTORAL, SC**, acredita su calidad como persona moral, mediante escritura pública, que contiene 11,989 (once mil novecientos ochenta y nueve) debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, bajo Inscripción No. 581426.

2.2 Que el **C. JESÚS OSCAR CRESPO PALAZUELOS** cuenta con Poder de Administrador Único, y por tanto, tiene facultad para suscribir el presente contrato mediante testimonio de Escritura Pública No. 19,747 (diecinueve mil setecientos cuarenta y siete), otorgada ante fe del Notario Público 156, documento que se agregan en copia certificada al presente como Anexo.

2.3 Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Constitución numero 1061 Int. 1 Col. Jorge Almada, Culiacán, Sinaloa, mismo que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.

2.4 Que cuenta con la capacidad técnica, operativa y económica, así como los recursos humanos y materiales para la ejecución del diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES ELECTORALES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA, materia del presente contrato.

2.5 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **IEL070309QSA**.

3.- DE "LAS PARTES".

3.1 Que es su voluntad suscribir el presente contrato y se reconocen recíprocamente su personalidad jurídica y la capacidad legal con que se ostentan sus representantes, sin tener por lo tanto ninguna objeción respecto de las facultades que les han sido conferidas.

Expuesto lo anterior, "**LAS PARTES**" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Por el presente contrato "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" el servicio para el diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA.

Para tales efectos, "EL PROVEEDOR" se obliga a lo siguiente:

1. Diseño, programación, instalación, desarrollo, implementación y operación del sistema informático que permita realizar las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo del PRE aprobado por el Consejo General de "EL INSTITUTO", así como las condiciones establecidas en el Reglamento de Elecciones, su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 correspondiente a la Estructura de los Archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del PREP, la totalidad de sus apartados y demás normatividad aplicable.
2. Aprovisionamiento y habilitación de los 32 CATD aprobados, a partir del acuerdo que, para determinar su ubicación, emita "EL INSTITUTO". Para lo cual, se deberán realizar las adecuaciones físicas, el aprovisionamiento correspondiente de equipo de cómputo y equipo para la digitalización de las actas, equipo de telecomunicaciones que "EL PROVEEDOR" considere necesario en cada lugar, de acuerdo a las capacidades técnicas con las que cuente cada sitio donde serán instalados los CATD, sin que dichos equipos pasen a formar parte de "EL INSTITUTO", siendo propiedad exclusiva de "EL PROVEEDOR".
3. La elaboración de materiales de capacitación, la capacitación del personal que se contrate, y demás actividades que se requieran para facilitar la realización de las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo aprobado por el

Consejo General de "EL INSTITUTO", tanto en los simulacros como en la operación del PREP.

4. Instalar un sistema de video vigilancia a través de cámara web en cada uno de los CATD y en las oficinas de Coordinación General de proyecto, siempre y cuando las capacidades técnicas de cada ubicación lo permitan, sin que estos equipos pasen a formar parte de "EL INSTITUTO".
5. Establecer y definir todas las actividades que se describen en la propuesta técnica, desde su desarrollo o generación hasta su implementación, operación y entrega, en un calendario de actividades o de trabajo.
6. Realizar al menos 3 (tres) simulacros, conforme al calendario en el mes previo de la jornada electoral.
7. Llevar a cabo una prueba integral que sirva para verificar el funcionamiento del sistema informático del PREP, previo al inicio de los simulacros correspondientes.
8. Otorgar todas las facilidades al personal del IEES, a la y los integrantes del COTAPREP, representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidaturas Independientes, así como el personal del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de las actividades de seguimiento y asesoría del PREP.
9. Brindar al ente auditor todas las facilidades necesarias para el desarrollo de los trabajos que realice en materia de auditoría al PREP.
10. Publicar los datos que se establecen en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, Anexos 13 y 18.5; asimismo, de mantenerlos publicados permanentemente, en el caso, de que "EL INSTITUTO" así lo determine, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 353, numeral 9 del reglamento invocado en este punto, o en su caso, entregar a "EL INSTITUTO" toda la información generada durante la operación del PREP.

11. Dar cumplimiento, en lo relativo a la implementación y operación del PREP, a los acuerdos que emita "EL INSTITUTO" y el Instituto Nacional Electoral, así como, a las recomendaciones que emita el Comité Técnico Asesor en materia del PREP.
12. Dar cumplimiento a las medidas sanitarias derivadas de la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) que establezcan las autoridades de salud competentes y el IEES.
13. Proveer el aplicativo para la toma de fotografías de las Actas de Escrutinio y Cómputo con dispositivo móvil desde las casillas (PREP Casilla).

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" pagará por el servicio para el diseño, programación, instalación, implementación y operación del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 DEL ESTADO DE SINALOA, objeto de este contrato, la cantidad de \$24,968,965.52 (veinticuatro millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 m.n.) más el impuesto al valor agregado correspondiente, cuyo importe asciende a la cantidad de \$ 3,995,034.48 (tres millones novecientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos 48/100 m.n.), dando un importe total de \$28,964,000.00 (veintiocho millones novecientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.).

Dicho pago se efectuará de la manera siguiente un primer pago del 30% de anticipo, a la firma del contrato; un segundo pago del 40% al momento de la instalación de la totalidad de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos CATD y un tercer pago del 30% al concluir a entera satisfacción la prestación del servicio, todos los pagos incluirán el IVA.

Para gestionar dichos pagos, el proveedor deberá enviar a la Coordinación Administrativa del "EL INSTITUTO" la factura electrónica (CFDI), debidamente requisitada, en el domicilio señalado en el punto 1.2. del apartado de declaraciones del presente contrato.

La Coordinación Administrativa, llevará a cabo la verificación del cumplimiento de las condiciones para el pago y la debida consignación de los datos en los documentos tales como: requisitos fiscales, descripción de los servicios, cálculos, precios unitarios, etc., y si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con el pago de los servicios. El anticipo se pagará de manera inmediata y el resto de los pagos,

a más tardar cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del Instituto.

TERCERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio para el diseño, programación, instalación, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2020-2021 del Estado de Sinaloa a partir de la firma del presente contrato; “EL INSTITUTO” se reserva el derecho de comprobar la calidad del servicio prestado y verificar que las características del servicio que proporciona “EL PROVEEDOR” cumplan con las especificaciones requeridas en los términos del procedimiento adquisitivo que dio origen al presente contrato y que se mencionan en sus propuestas. Para ese efecto, “EL PROVEEDOR” expresa su conformidad en el sentido de que el ente auditor que designe “EL INSTITUTO”, realice las pruebas de funcionalidad y seguridad tanto a la infraestructura que soportará el PREP, como a los sistemas que se requieren para llevar a cabo el proceso técnico operativo, además de aceptar que se les hagan las pruebas suficientes para garantizar la seguridad de la información. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar los recursos tecnológicos y el personal para llevar a cabo el procedimiento para efectuar la auditoría de conformidad con el Capítulo III, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.

En caso de que “EL INSTITUTO” detecte errores, defectos o vicios en el servicio para la instrumentación del programa de resultados electorales preliminares, “EL PROVEEDOR”, se obliga a subsanarlos a satisfacción de “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se le dé aviso.

CUARTA.- “EL PROVEEDOR” y “EL INSTITUTO” acuerdan que ambas partes pondrán todo su esfuerzo para que la información materia del presente contrato sea procesada y difundida oportunamente, quedando a cargo de “EL INSTITUTO” el proporcionar puntualmente los datos electorales y acreditaciones, para que “EL PROVEEDOR” cuente con dicha información, la procese y difunda a tiempo, en el entendido que “EL INSTITUTO” determinará la hora de inicio de su publicación, la cual será entre las 18:00 y las 20:00 horas del horario local del estado de Sinaloa, quedando prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora que se determine, así mismo, el cierre de publicación será en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación.

“EL INSTITUTO” podrá determinar el cierre de la publicación, siempre y cuando, se logre el 100 % del registro de las Actas PREP esperada y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas. Para efectos de lo anterior, se entenderá que las Actas PREP son registradas cuando su estatus ha sido asentado en el sistema informático, sean contabilizadas o no, incluyendo las actas fuera de catálogo y las catalogadas como “Sin Acta”.

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” garantiza que el servicio del PREP, estará libre de errores, defecto o vicios, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta técnica, y que, en su caso, llegaran a surgir nuevas durante la prestación del servicio, “EL PROVEEDOR” se obliga a subsanarlas de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el anexo técnico.

SEXTA.- “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” el importe pactado en la cláusula segunda.

La facturación del proveedor se presentará indicando el importe del servicio, el 16% del IVA e importe total.

SÉPTIMA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” en la fecha en que sea firmado el presente contrato, fianza por un valor igual al 10% del importe total señalado en la cláusula segunda, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Dicha fianza deberá ser otorgada por una Institución Mexicana de Fianzas legalmente autorizada o mediante cheque de caja, a favor de “EL INSTITUTO”, y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

2.4.1 Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

2.4.2 Que en el caso de prórroga del presente contrato automáticamente la vigencia de la fianza se ampliará en concordancia con dicha prórroga.

2.4.3 Que la fianza solo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL INSTITUTO”.

2.4.4 Que la institución afianzadora acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Fianzas vigente.

2.4.5 Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

2.4.6 Que la fianza permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

OCTAVA.- “EL INSTITUTO” podrá sancionar a “EL PROVEEDOR”, y aplicar penas convencionales haciendo efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato; una vez que el presente contrato ha sido adjudicado, por cada día de retardo en la presentación del servicio objeto del mismo, se impondrá una pena convencional. Esta pena no excederá del 10% del monto total del contrato. En todo caso se hará efectiva la fianza de cumplimiento del contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá ser notificado por “EL INSTITUTO” y este tendrá 2 días hábiles como máximo para el cumplimiento del atraso previamente notificado. Si “EL PROVEEDOR” no cumple con este plazo establecido se aplicará la pena convencional establecida en esta cláusula.

NOVENA.- “EL INSTITUTO” se obliga, a proporcionar las facilidades, seguridad y el espacio suficiente para que el personal contratado pueda realizar sus actividades necesarias para la implementación y operación del PREP, la instalación de la oficina de Coordinación General, los CATD autorizados, así como, el suministro de energía eléctrica, agua potable, baños y demás servicios básicos, para cada una de las actividades a realizar en la prestación del servicio.

DÉCIMA.- “EL PROVEEDOR” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respeto de lo pactado en el presente contrato, por lo que de presentarse alguna reclamación a “EL INSTITUTO” con este motivo “EL PROVEEDOR” conviene desde ahora en pagar cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL INSTITUTO” a más tardar a los 10 días naturales contados a partir de que sea notificado de ello.

De igual manera, “EL PROVEEDOR” asume toda la responsabilidad derivada de la relación laboral o de servicios profesionales que se brinden para cumplir con el objeto del

presente contrato, eximiendo a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, legal o de cualquier tipo derivada de dicha actividad.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" pondrá a disposición de "EL INSTITUTO" el software de su propiedad, con objeto de que se pueda instrumentar el PREP, no concediendo con ello derecho alguno a "EL INSTITUTO" sobre dicho software, excepto el beneficio que se concederá para proporcionar al público en general y a los partidos políticos, los resultados que paulatinamente se vayan dando a conocer, mismos que se podrán consultar vía internet en la página previamente definida por "LAS PARTES".

"EL PROVEEDOR", se reserva la propiedad intelectual e industrial de su software para operar el PREP, así como todas las adecuaciones llevadas a cabo para cumplir con los requerimientos establecidos en la propuesta técnica.

DÉCIMA SEGUNDA.- las partes acuerdan que "EL PROVEEDOR" queda exento de cualquier responsabilidad por:

A) Ataques al sistema PREP por parte de "INTRUSOS CIBERNÉTICOS" conocidos como "HACKERS", en el entendido que el "EL PROVEEDOR" utilizará toda su capacidad, experiencia y las herramientas tecnológicas que tengan a su alcance para contrarrestar los mismos, debiendo informar a la brevedad posible a "EL INSTITUTO" de la contingencia y la solución dada a la misma.

b) Por interrupciones en los servicios o en el mismo PREP, cuando éstas obedezcan a: caso fortuito y fuerza mayor, pudiendo ser de manera enunciativa mas no limitativa, hechos de la naturaleza, actos vandálicos o similares, ataques al sistema del PREP por parte de "INTRUSOS CIBERNÉTICOS", o cualquier otro, ya sean estos en la infraestructura de acceso a internet o en el propio internet público, o en la red de energía eléctrica o similares, así como tampoco por cualquier daño que llegaran a sufrir los equipos de "EL PROVEEDOR" por alguna de las causas mencionadas anteriormente, o bien por daños en bienes o equipos propiedad de "EL INSTITUTO", o bienes de "EL PROVEEDOR", e incluso daños en el personal contratado por cualquiera de las partes.

c) Por el uso que se le dé a la información materia de este contrato por parte de los usuarios de la red mundial de internet conocida por sus siglas en inglés con WWW (WORLD WIDE WEB).

d) Por cualquier error que se llegare a cometer en caso de que algún acta de escrutinio y cómputo contenga datos distintos de identificación de sección o tipo de casilla a aquellos

que previamente le fueron asignados conforme a los catálogos que “EL INSTITUTO” entregue a “EL PROVEEDOR”.

e) Por falta de captura, cómputo y publicación de las actas cuando éstas no cumplan con las características acordadas, así como aquellas a que se obligó “EL INSTITUTO” para el reconocimiento digital y procesamiento de las actas en el sistema PREP ofertado por “EL PROVEEDOR”.

f) Para obtener el fin consignado en este contrato, “EL INSTITUTO” se compromete a tomar las medidas necesarias, a fin de que las personas y autoridades electorales distritales y municipales que deban proporcionar las actas a “EL PROVEEDOR” se las entreguen oportuna e inmediatamente, a fin de que a su vez pueda ser digitalizada y posteriormente ser capturadas a través de su imagen e integrar la información de éstas en la base de datos del PREP, quedando sin responsabilidad “EL PROVEEDOR” ante la negligencia de las personas que deban proporcionar dichas actas.

A su vez, “EL INSTITUTO” se obliga a:

- a) Aceptar que “EL PROVEEDOR” será la única empresa u organismo responsable de publicar en la red de internet, los resultados del “PREP” durante la jornada electoral del 06 de junio de 2021 en el Estado de Sinaloa, a partir de las 20:00 horas -hora local- y de que le sean proporcionados los “DOCUMENTOS PREP” a “EL PROVEEDOR” de manera oportuna por “EL INSTITUTO”, salvo los difusores oficiales autorizados por “EL INSTITUTO”, a quienes se les proporcionarán cortes de información cada determinado tiempo, en la medida de las capacidades técnicas con las que se cuenten, siempre dando prioridad a la publicación de internet primaria.
- b) Establecer y entregar a “EL PROVEEDOR” dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del contrato los diseños preliminares con los que se cuente hasta el momento, correspondientes a los “DOCUMENTOS PREP”, de cada una de las candidaturas, con las siguientes características:
 - a. ENTIDAD FEDERATIVA
 - b. NÚMERO DE MUNICIPIO
 - c. NÚMERO DE DISTRITO
 - d. MUNICIPIO

- e. NÚMERO DE SECCIÓN
 - f. TIPO DE CASILLA
 - g. NÚMERO DE CASILLA
- c) Entregar a “EL PROVEEDOR” a más tardar quince días naturales antes de la jornada electoral, los diseños finales por cada candidatura y distrito correspondientes a los “DOCUMENTOS PREP”, a efecto de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en posibilidad de hacer las modificaciones y ajustes correspondientes en el sistema de cómputo que será utilizado en la jornada electoral.
- d) Proporcionar a “EL PROVEEDOR” dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la firma de este contrato, los locales con espacio necesario, energía eléctrica y accesibles para la implementación, instalación de equipos y correcto funcionamiento del PREP en los CATDS.
- e) Proporcionar a “EL PROVEEDOR” diez días después de la firma del contrato, la información que hasta ese momento se tenga consistente en:
- a. Candidaturas por distrito.
 - b. Partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes que contienden por distrito.
 - c. Formatos preliminares de todos y cada uno de los documentos prep por cada elección y por cada una de sus modalidades.
 - d. Catálogo preliminar en un solo archivo en formato de hoja de cálculo que contenga los siguientes datos separados por columna:
 - i. Distrito
 - ii. Municipio
 - iii. Sección
 - iv. Tipo de casilla
 - v. Lista nominal de la casilla
 - vi. Boletas enviadas por casilla
 - vii. Domicilio de la casilla
 - viii. Ubicación de la casilla

- ix. Mecanismo de traslado
- x. Nombre del presidente de casilla
- xi. Nombre del secretario de casilla
- xii. Nombre del primer escrutador
- xiii. Nombre del segundo escrutador
- xiv. Nombre del suplente por cada cargo

Lo anterior a efecto de que "EL PROVEEDOR" pueda iniciar la configuración y programación de los sistemas de cómputo, digitalización, captura y publicación para ser usados tanto en los simulacros oficiales, como en la Jornada Electoral, con base en las necesidades del estado de Sinaloa.

- f) Proporcionar a "EL PROVEEDOR" dentro de los veinte días anteriores al primer simulacro, los catálogos preliminares indicados en el inciso que antecede, que hasta ese momento se tengan; debiéndose entregar en un solo archivo en formato de hoja de cálculo que contenga los datos separados por columna.
- g) "EL INSTITUTO" se obliga a incluir en las actas de escrutinio y cómputo, elementos o marcas que faciliten su digitalización y reconocimiento o procesamiento automatizado de sus datos de identificación. "EL PROVEEDOR", podrá revisar la correcta impresión de dichos datos de identificación.
- h) "EL INSTITUTO" se compromete a distribuir las actas de cada una de las casillas, según le corresponda conforme a la identificación de éstas atendiendo al municipio, sección, tipo de casilla que les pertenezca a cada una. Cualquier error en la distribución o error en la identificación de sección y tipo de casilla asentado en las actas en casillas que les corresponda que se traduzca en error en la identificación, captura y publicación en el PREP no será atribuible a "EL PROVEEDOR".
- i) Para efectos de la implementación del PREP, a partir de la firma del presente contrato, durante la instalación de equipos en los CATD y CCV, pruebas técnicas de operación y jornada electoral, se establece que todos los días y horas son hábiles, por lo que "EL INSTITUTO" y consejos municipales y distritales permitirán

al personal autorizado por "EL PROVEEDOR", previa coordinación, el acceso a las instalaciones de todos y cada uno de los CATDS para que puedan realizar tantas pruebas, capacitaciones de personal, ejercicios diarios, actividades de instalación, soporte, capacitaciones, laboratorios, ajustes, reparaciones y otras actividades que "EL PROVEEDOR" considere necesarias.

- j) Por lo anterior, "EL INSTITUTO", se obliga a notificar a los consejos municipales y/o distritales, que deberán brindar en todo momento y hora las facilidades de acceso al personal autorizado por "EL PROVEEDOR", para la instalación, soporte capacitaciones y simulacros durante la vigencia del presente contrato. Asimismo, deberá garantizar que dichos CATDS contemplen como días laborables para el PREP, de lunes a domingo.

DÉCIMA TERCERA.- "EL PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona física o moral los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso previamente comunicará por escrito su conformidad ante "EL INSTITUTO".

DÉCIMA CUARTA.- "EL PROVEEDOR", se obliga a que todas las acciones del PREP para el Proceso Electoral Local 2020-2021 del Estado de Sinaloa y los datos que se generen como resultado de la prestación del servicio, serán realizados por "EL PROVEEDOR", y que no serán subcontratados de manera parcial o total con terceros.

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen que "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

- a) Cuando el proveedor no afiance el cumplimiento del contrato según los términos señalados en la cláusula sexta de este contrato.
- b) Cuando el proveedor modifique las características del servicio objeto del presente contrato sin autorización expresa del Instituto.
- c) Cuando el proveedor no proporcione el servicio contratado, de conformidad con los plazos estipulados en el mismo, con lo presentado en su propuesta técnica, con lo estipulado en las bases y anexo técnico, así como con lo que dispone en la materia el reglamento de elecciones.

DÉCIMA SEXTA.- Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión consignadas en la cláusula precedente, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" en forma inmediata a efecto de que éste exponga lo que a sus intereses convenga en un plazo no mayor de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificado el incumplimiento de que se le impute.

En caso de persistir la causa de rescisión, una vez agotado el plazo referido en el párrafo anterior, el Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato. Una vez aplicado el procedimiento previsto por la Ley, si las causas de rescisión fueran imputables a "EL PROVEEDOR" se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y se abstendrá "EL INSTITUTO" de cubrir los importes restantes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- En todo lo no estipulado en el presente contrato, se sujetará a lo establecido en los términos del procedimiento adquisitivo que dio origen al presente contrato y en su anexo técnico.

DÉCIMA OCTAVA.- "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad para él, por causa de fuerza mayor debidamente acreditada y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" de dicha circunstancia, con cuando menos cinco días naturales de anticipación.

"EL INSTITUTO" se compromete a cubrir los pagos pendientes al proveedor, debidamente acreditados, de los costos relacionados al avance de proyecto que se tenga al momento de la cancelación.

DÉCIMA NOVENA.- para todo lo relativo al cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato las partes se someten expresamente a la aplicación de la legislación de la materia, así como a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Estatales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran tener derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.

VIGÉSIMA.- "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR", hacen constar que la vigencia del presente contrato es a partir de la firma del mismo, y su conclusión, será hasta que se hayan cumplido los términos y objeto del mismo, salvo se dé por rescindido, conforme lo

dispuesto en las cláusulas Decima Sexta, Decima Séptima y Decima Novena del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- “EL INSTITUTO” y “EL PROVEEDOR”, hacen constar que en la celebración del presente contrato no existe error, dolo, mala fe o vicios del consentimiento que lo invaliden.

Leído el presente instrumento a “LAS PARTES” que en el intervienen y conformes con su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en dos tantos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 08 días del mes de febrero del año 2021.

POR “EL PROVEEDOR”



JESÚS OSCAR CRESPO PALAZUELOS

POR “EL INSTITUTO”



MTRA. KARLA GABRIELA PERAZA ZAZUETA
CONSEJERA PRESIDENTA



LIC. ARTURO FAJARDO MEJÍA
SECRETARIO EJECUTIVO

Reporte de habilitación CATD Parte 1

**PREP 2021
IEES**

Abril 2021

Confidencialidad del Documento

© 2021 Informática Electoral. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento es propiedad de Informática Electoral, cualquier reproducción parcial o total, está estrictamente prohibida si no se hace con el permiso estricto y por escrito de Informática Electoral. Este documento está sujeto a cambios. Cualquier comentario, corrección o pregunta deberán ser dirigidos al autor.
http://informaticaelectoral.com/aviso_de_privacidad.pdf



Contenido

0	Prefacio	6
1	Introducción.....	7
1.1	Criterios y ponderación para la evaluación de los CATD y CCV	7
2	Inspección previa	9
2.1	CATD 01 - Choix, El Fuerte	11
2.2	CATD 02 - Ahome	14
2.3	CATD 03 - Ahome	17
2.4	CATD 04 - Ahome y Guasave	20
2.5	CATD 05 - Ahome	23
2.6	CATD 06 - Sinaloa y Guasave.....	26
2.7	CATD 07 - Guasave	29
2.8	CATD 08 - Guasave	32
2.9	CATD 09 - Salvador Alvarado y Angostura.....	35
2.10	CATD 10 - Mocorito, Badiraguato y Navolato	38
2.11	CATD 11 - Navolato	41
2.12	CATD 12 - Culiacán	44
2.13	CATD 13 - Culiacán	47
2.14	CATD 14 - Culiacán	50
2.15	CATD 15 - Culiacán	53

Contenido de tablas

Tabla 1. Criterios de evaluación.....	7
Tabla 2. Tabla de evaluación CATD's.....	10
Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento	10
Tabla 4. Evidencia de habilitación CATD 1	12
Tabla 5. Evidencia de habilitación CATD 2	15
Tabla 6. Evidencia de habilitación CATD 3	18
Tabla 7. Evidencia de habilitación CATD 4	21
Tabla 8. Evidencia de habilitación CATD 5	24
Tabla 9. Evidencia de habilitación CATD 6	27
Tabla 10. Evidencia de habilitación CATD 7	30
Tabla 11. Evidencia de habilitación CATD 8	33
Tabla 12. Evidencia de habilitación CATD 9	36
Tabla 13. Evidencia de habilitación CATD 10	39
Tabla 14. Evidencia de habilitación CATD 11	42
Tabla 15. Evidencia de habilitación CATD 12	45
Tabla 16. Evidencia de habilitación CATD 13	48
Tabla 17. Evidencia de habilitación CATD 14	51
Tabla 18. Evidencia de habilitación CATD 15	54

Contenido de imágenes

Imagen 1. Ubicación CATD 1.....	11
Imagen 2. Distribución CATD 1.....	13
Imagen 3. Ubicación CATD 2.....	14
Imagen 4. Distribución CATD 2.....	16
Imagen 5. Ubicación CATD 3.....	17
Imagen 6. Distribución CATD 3.....	19
Imagen 7. Ubicación CATD 4.....	20
Imagen 8. Distribución CATD 4.....	22
Imagen 9. Ubicación CATD 5.....	23
Imagen 10. Distribución CATD 5.....	25
Imagen 11. Ubicación CATD 6.....	26
Imagen 12. Distribución CATD 6.....	28
Imagen 13. Ubicación CATD 7.....	29
Imagen 14. Distribución CATD 7.....	31
Imagen 15. Ubicación CATD 8.....	32
Imagen 16. Distribución CATD 8.....	34
Imagen 17. Ubicación CATD 9.....	35
Imagen 18. Distribución CATD 9.....	37
Imagen 19. Ubicación CATD 10.....	38
Imagen 20. Distribución CATD 10.....	40
Imagen 21. Ubicación CATD 11.....	41
Imagen 22. Distribución CATD 11.....	43
Imagen 23. Ubicación CATD 12.....	44
Imagen 24. Distribución CATD 12.....	46
Imagen 25. Ubicación CATD 13.....	47
Imagen 26. Distribución CATD 13.....	49
Imagen 27. Ubicación CATD 14.....	50
Imagen 28. Distribución CATD 14.....	52
Imagen 29. Ubicación CATD 15.....	53
Imagen 30. Distribución CATD 15.....	55

Glosario de términos

- a) **CATD:** Centro de Acopio y Transmisión de Datos.
- b) **CCV:** Centro de Captura y Verificación.
- c) **LAN:** Red de Área Local (por sus siglas en inglés).
- d) **OPLE:** Organismo Público Local Electoral
- e) **PREP:** Programa de Resultados Electorales Preliminares.
- f) **PTO:** Proceso Técnico Operativo.
- g) **UPS:** Equipos de energía ininterrumpida.
- h) **IEES:** Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

0 Prefacio

Control de versión y administración del documento:

Es responsabilidad del lector asegurarse de tener la última versión de este documento. Cualquier pregunta acerca del mismo deberá dirigirse al propietario de este documento.

Autor de este documento:

El contacto principal para preguntas y observaciones acerca de este documento es:
Carlos Eugenio González Peiro.
IE®

Confidencialidad:

La información contenida en este documento deberá tratarse como información privada y confidencial. Esta información no deberá divulgarse a otras personas que no estén involucradas en el proyecto **PREP 2021 - IEES**.

Historia de cambios en el documento:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Febrero 2018	1.0	Generación de documento	Omar Alonso Zazueta Bustamante
Abril 2021	1.1	Integración de conceptos	Carlos Eugenio González Peiro

Firmas de autorización:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sergio Manuel Aréchiga Aguilar Coordinador de TI	Carlos Eugenio González Peiro Administrador de proyecto	Jorge Omar Padilla Tizoc Director de Proyecto

1 Introducción

Este reporte tiene como objetivo proporcionar la información acerca de la habilitación de los inmuebles que se utilizarán como Centros de Acopio y Transmisión de Datos, como lo marca el capítulo VII del Anexo 13 (lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP), con la finalidad de garantizar que se cubran las especificaciones marcadas en dicho anexo para la correcta operación ininterrumpida de PREP.

- I. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para que los integrantes de los consejos locales, distritales y municipales, según corresponda, puedan acceder a supervisar su operación sin obstaculizar el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del Proceso Técnico Operativo (PTO).
- II. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada iluminación y ventilación, así como con el mobiliario suficiente para la operación. De la misma manera, deberá acondicionarse de tal forma que garantice la integridad y seguridad del personal, equipos, materiales e información.

Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATD dependerán del número de personas que participen en el desarrollo de las fases del PTO, considerando suficiente espacio para realizar todas las actividades del proceso de manera ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del personal y el equipo del CATD.

1.1 Criterios y ponderación para la evaluación de los CATD y CCV

Descripción	Rango de puntaje	Porcentaje máximo
Seguridad física	0 - 4	40 %
Espacio para personal	0 - 2	30 %
Climatizado	0 - 2	10 %
Cantidad de contactos	0 - 3	10 %
Iluminación	0 - 2	10 %

Tabla 1. Criterios de evaluación

1.1.1 Seguridad física

- Área cerrada o delimitada (valor 1 punto)
- Ventas con protección (valor 1 punto)
- Puerta de acceso (valor 1 punto)
- Chapa o candado para resguardar el área (valor 1 punto)

1.1.2 Espacio para personal

- El personal y los equipos pueden ser ubicados en el área asignada (valor 1 punto)
- Es posible la libre movilidad dentro del área (valor 1 punto)

1.1.3 Climatizado

- No (valor 0 punto)
- Comparte el a/c de otra área o cuenta con ventilador de techo (valor 1 punto)
- Sí (valor 1 punto)

1.1.4 Cantidad de contactos

- Escribir cantidad de contactos en el área (valor 1 punto)

NOTA: se contabilizan la cantidad de contactos en el área PREP asignada, a partir de 3 contactos solamente se escribe 3 puntos.

1.1.5 Iluminación

- No tiene
- Cuenta con iluminación artificial, aunque sea compartida con otras áreas (valor 1 punto)
- Posee iluminación natural mediante ventanas (valor 1 punto)

2 Inspección previa

Durante el periodo del martes 23/02/21 al miércoles 03/03/21, el equipo de supervisión técnica realizó una visita previa a los inmuebles que el OPLE asignó como CATD, para verificar si cumplen con los requerimientos mínimos establecidos para el correcto funcionamiento de la infraestructura técnica del CATD para el proceso PREP 2021.

Los agentes de soporte técnico realizaron un listado de actividades para supervisión del inmueble, generando el presente reporte, el cual contiene la aprobación o rechazo de los inmuebles, así como también la solicitud de modificaciones a la infraestructura.

Del recorrido de inspección de los CATD se generaron las siguientes observaciones:

ID CATD	Municipio	Evaluación					
		Seguridad	Espacio	Clima	Contactos	Iluminación	Total
1	El Fuerte	20%	30%	0%	0%	10%	60%
2	Los Mochis	40%	30%	0%	10%	10%	90%
3	Los Mochis	40%	15%	5%	10%	10%	80%
4	Los Mochis	10%	30%	0%	6%	10%	56.66%
5	Los Mochis	40%	30%	0%	10%	10%	90%
6	Sinaloa de Leyva	10%	15%	5%	10%	5%	45%
7	Guasave	10%	15%	5%	10%	5%	45%
8	Guasave	40%	15%	10%	6%	10%	81.66%
9	Guamúchil	40%	15%	10%	10%	10%	85%
10	Mocorito	20%	15%	5%	3%	5%	48.33%
11	Navolato	40%	30%	5%	10%	5%	90%
12	Culiacán	40%	30%	10%	10%	10%	100%
13	Culiacán	40%	30%	5%	10%	5%	90%
14	Culiacán	40%	30%	0%	10%	5%	85%
15	Culiacán	30%	30%	0%	6%	5%	71.66%
16	Culiacán	30%	30%	10%	10%	10%	90%
17	Culiacán	20%	30%	5%	3%	5%	63.33%
18	Culiacán	10%	30%	0%	6%	10%	56.66%
19	La Cruz	10%	30%	5%	6%	5%	56.66%
20	Mazatlán	10%	15%	5%	3%	5%	38.33%

21	Mazatlán	10%	15%	5%	3%	5%	38.33%
22	Mazatlán	10%	15%	5%	10%	5%	45%
23	Mazatlán	40%	30%	5%	6%	5%	86.66%
24	El Rosario	30%	15%	0%	0%	5%	50%
25	Choix	40%	30%	5%	6%	10%	91.66%
26	Angostura	40%	30%	5%	6%	10%	91.66%
27	Navolato	40%	30%	0%	3%	5%	78.33%
28	Badiraguato	40%	30%	0%	10%	5%	85%
29	Cosalá	40%	30%	5%	10%	10%	95%
30	San Ignacio	0%	15%	5%	3%	5%	28.33%
31	Concordia	30%	30%	0%	10%	5%	75%
32	Escuinapa	30%	30%	10%	3%	10%	86.66%
Total		28%	25%	4%	7%	7%	71%

Tabla 2. Tabla de evaluación CATD's

Resultado de inspección	Cantidad de CATD	Porcentaje de cumplimiento
CATD con cumplimiento óptimo (mayor 70%)	19	70.92%
CATD "No aprobados"	13	29.08%

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento

2.1 CATD 01 - Choix, El Fuerte

2.1.1 Dirección

Reforma No. 100 Col. Centro C.P. 81820, El Fuerte, Sinaloa.



Imagen 1. Ubicación CATD 1

2.1.2 Fecha de Habilitación

Se realizó la visita el 18-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.1.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.1.4 Evidencia de habilitación


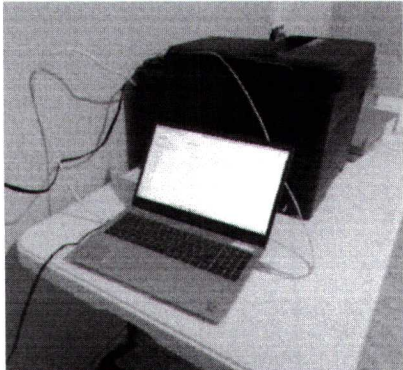
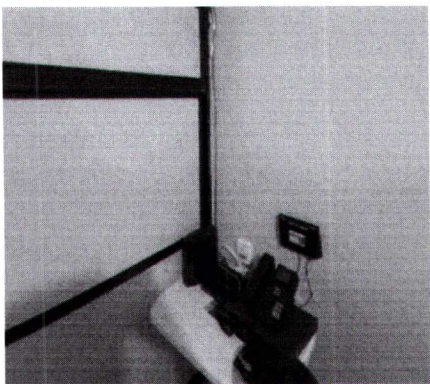
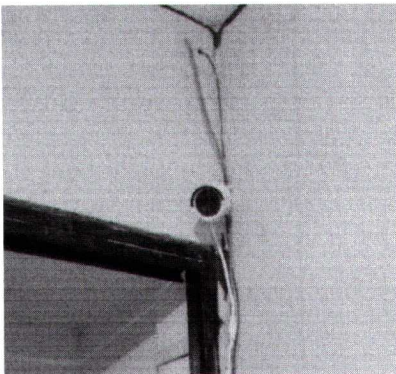
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 4. Evidencia de habilitación CATD 1

2.1.5 Distribución planeada

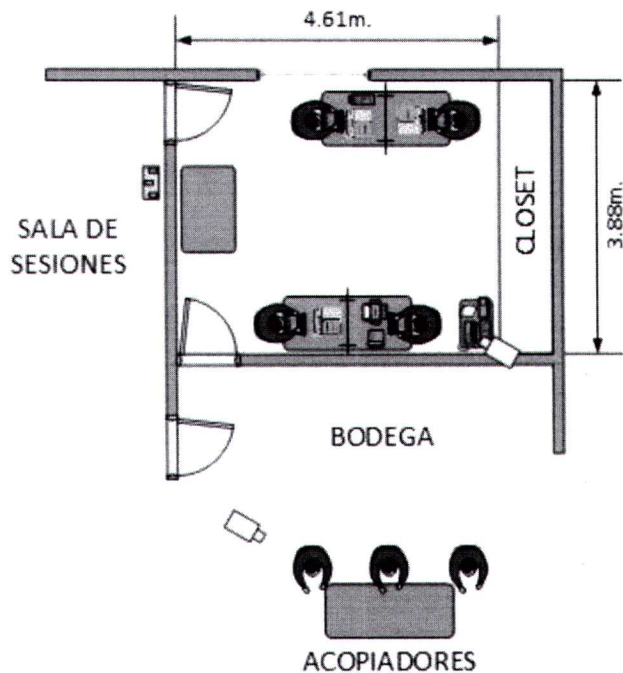


Imagen 2. Distribución CATD 1

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.2 CATD 02 - Ahome

2.2.1 Dirección

Genaro Estrada No. 801 Esq. Boulevard Rosales Col. Scally, C.P. 81247, Los Mochis, Sinaloa.

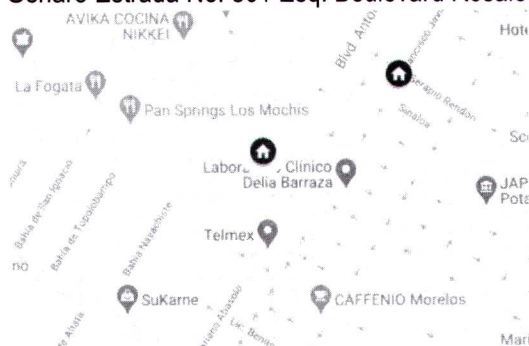


Imagen 3. Ubicación CATD 2

2.2.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 18-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.2.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.2.4 Evidencia de habilitación



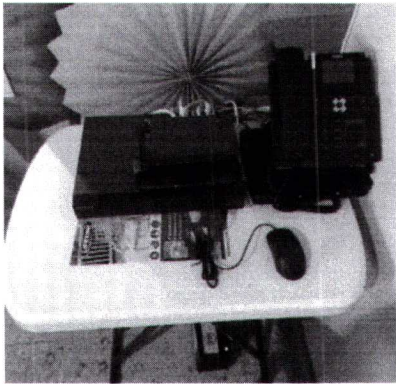
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 5. Evidencia de habilitación CATD 2

2.2.5 Distribución planeada

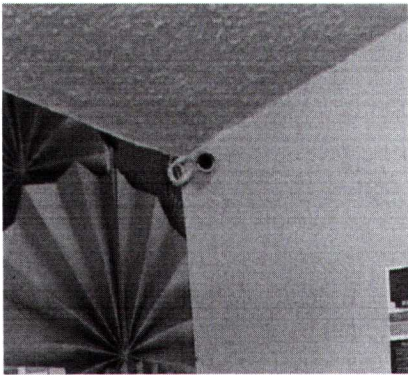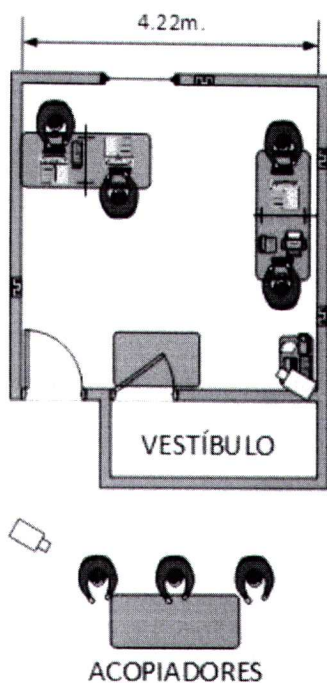

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 4. Distribución CATD 2

2.3 CATD 03 - Ahome

2.3.1 Dirección

Independencia No. 1200 Pte. Esq. Bahía de Ohuira Fracc. Jordán Madero, C.P. 81240, Los Mochis, Sinaloa.



Imagen 5. Ubicación CATD 3

2.3.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 18-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.3.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.3.4 Evidencia de habilitación


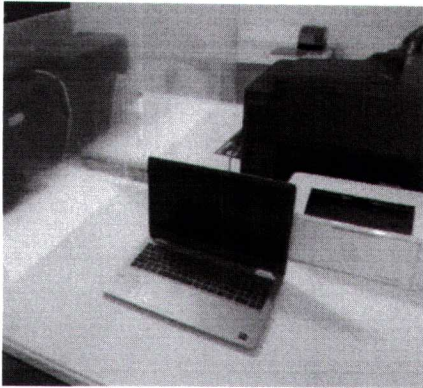

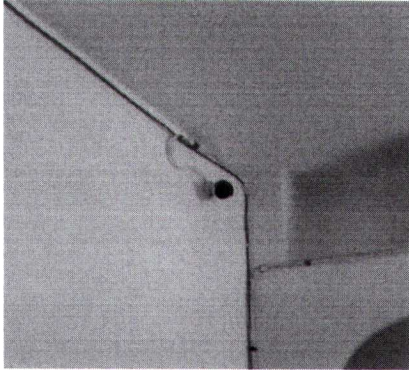
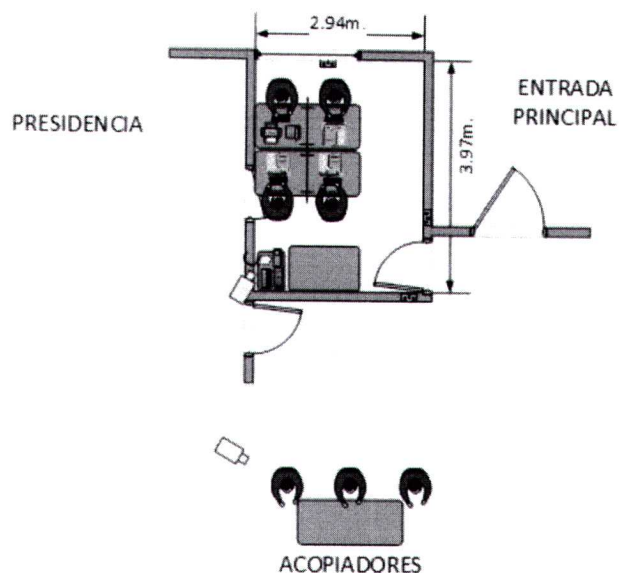
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 6. Evidencia de habilitación CATD 3

2.3.5 Distribución planeada



Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 6. Distribución CATD 3

2.4 CATD 04 - Ahome y Guasave

2.4.1 Dirección

Calle Javier Mina No. 299 Note. Esq. Con calle Serapio Rendón Col. Centro (Sector Fátima), C.P. 81220, Los Mochis, Sinaloa.

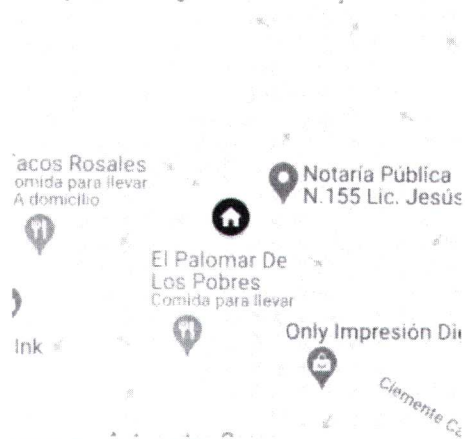


Imagen 7. Ubicación CATD 4

2.4.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 18-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.4.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.4.4 Evidencia de habilitación




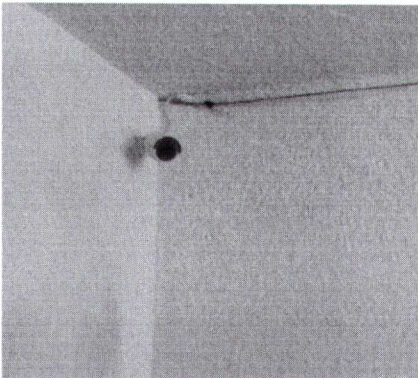
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 7. Evidencia de habilitación CATD 4

2.4.5 Distribución planeada

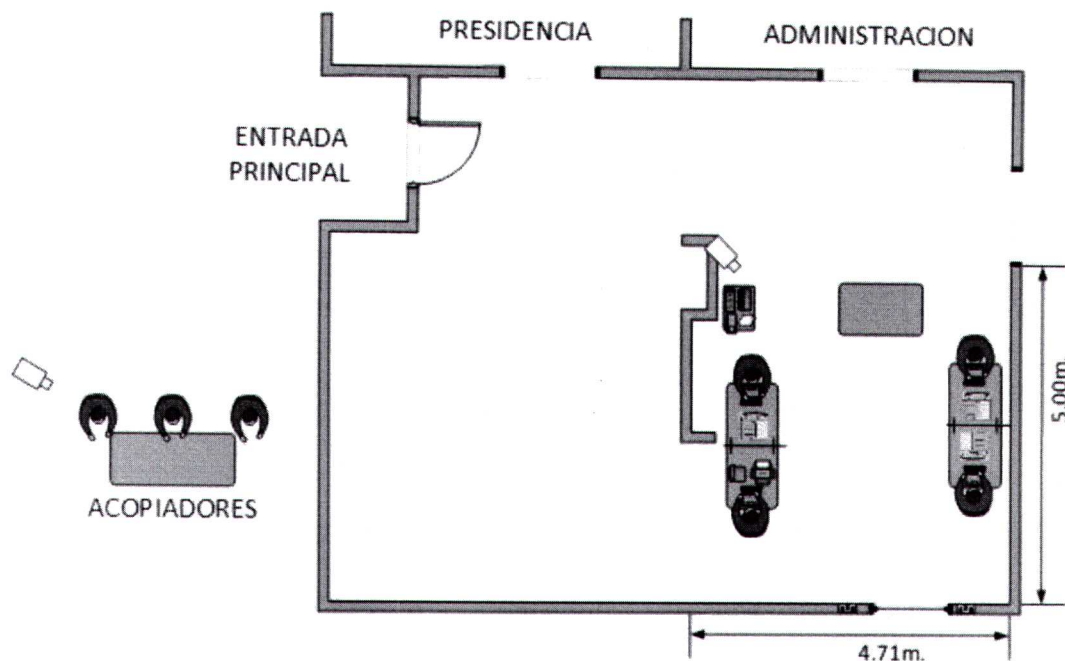


Imagen 8. Distribución CATD 4

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.5 CATD 05 - Ahome

2.5.1 Dirección

Calle Río Humaya No. 201 Nte. Esq. Con Aquiles Serdán Fracc. Skally, C.P. 81240, Los Mochis, Sinaloa.

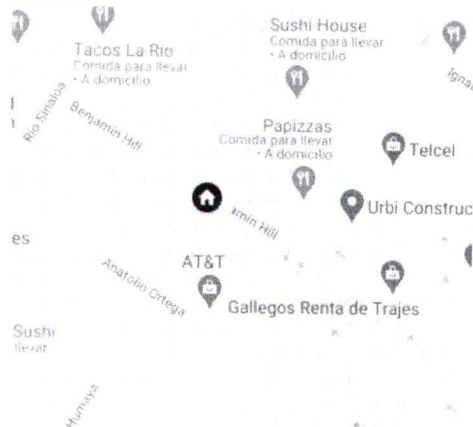


Imagen 9. Ubicación CATD 5

2.5.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 22-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.5.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.5.4 Evidencia de habilitación


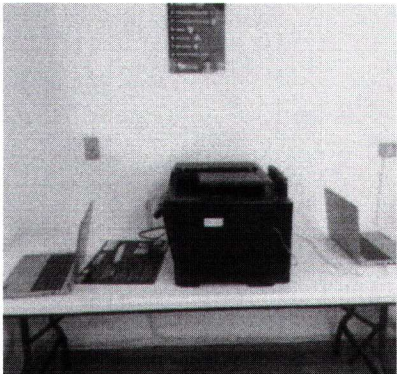
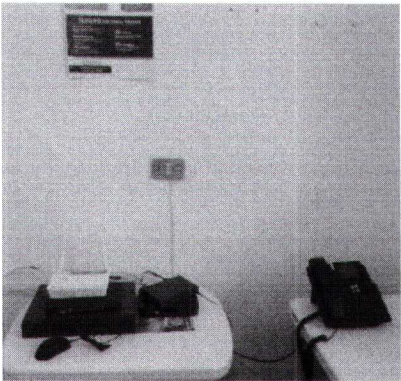
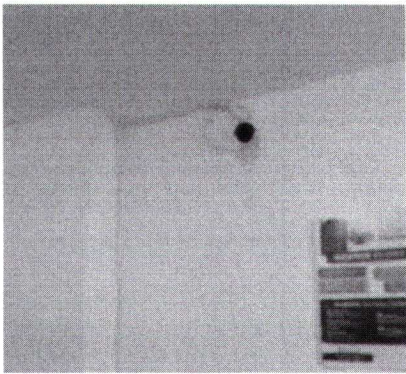
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 8. Evidencia de habilitación CATD 5

2.5.5 Distribución planeada

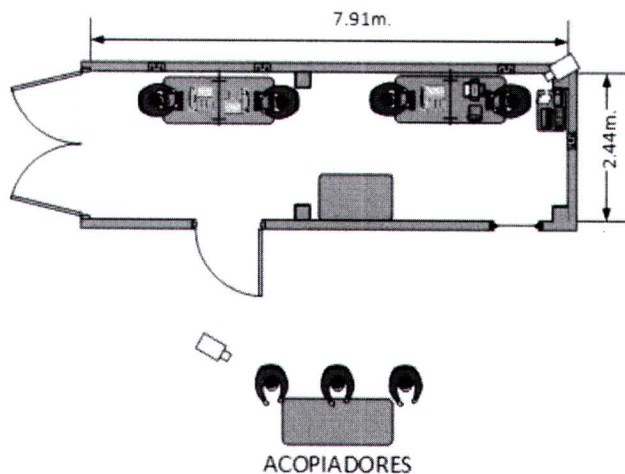


Imagen 10. Distribución CATD 5

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.6 CATD 06 - Sinaloa y Guasave

2.6.1 Dirección

Calle Benito Juárez No. 55 Entre Dan Gámez y Allende, Col. Centro, C.P. 81910, Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

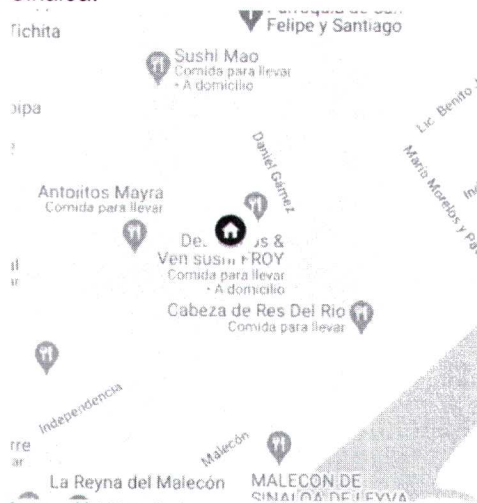


Imagen 11. Ubicación CATD 6

2.6.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 25-abril-2021, por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.6.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.6.4 Evidencia de habilitacion





Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 9. Evidencia de habilitacion CATD 6



2.6.5 Distribución planeada

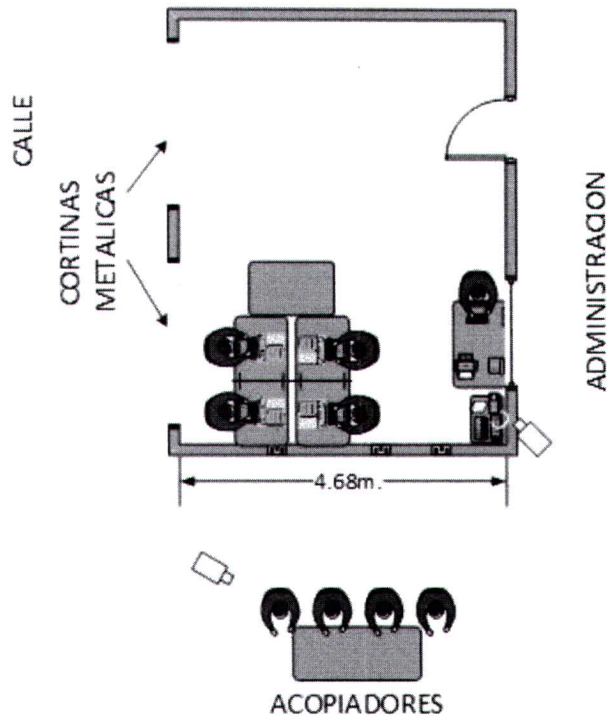


Imagen 12. Distribución CATD 6

Acopiadoras/acopiadores	4
Digitalizadoras/digitalizadores	4
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.7 CATD 07 - Guasave

2.7.1 Dirección

Vicente Guerrero No. 343 Local B Entre Gabriel Leyva y Emiliano Zapata Col. Centro, C.P. 81000 Guasave, Sinaloa.

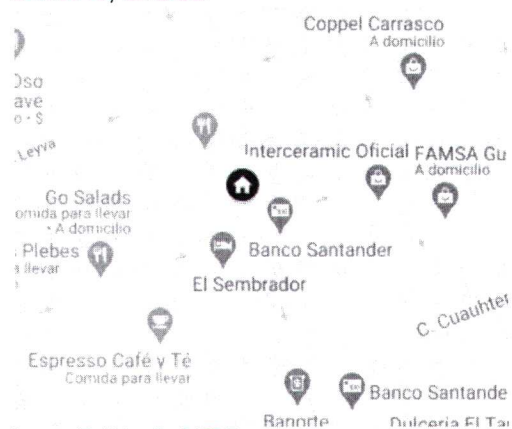


Imagen 13. Ubicación CATD 7

2.7.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 25-abril-2021 por Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez.

2.7.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.7.4 Evidencia de habilitacion


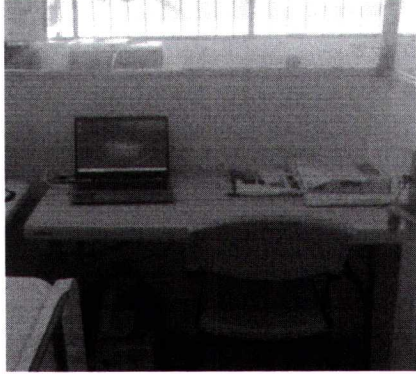

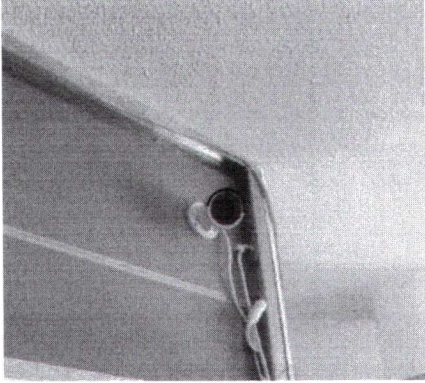
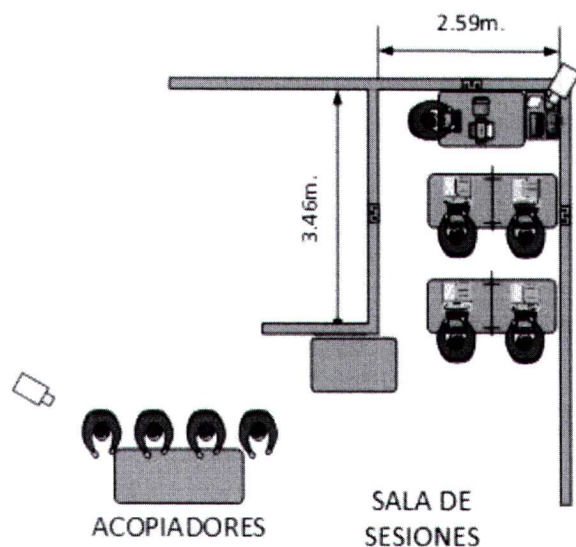
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 10. Evidencia de habilitación CATD 7

2.7.5 Distribución planeada



Acopiadoras/acopiadores	4
Digitalizadoras/digitalizadores	4
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 14. Distribución CATD 7

2.8 CATD 08 - Guasave

2.8.1 Dirección

Boulevard Felipe Ángeles No. 136 Col. Del Bosque, C.P. 81020, Guasave, Sinaloa.

TRAUMATOLOGO DR.
LÓPEZ ROMERO JOSÉ



Imagen 15. Ubicación CATD 8

2.8.2 Fecha de habilitación


Se realizó la visita el día 25-abril-2021 por Julio César Vizcarra Guerrero y Alfredo Garibaldi

2.8.3 Evidencia de adecuaciones realizadas



PREP

2021 • SIN



iees

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

2.8.4 Evidencia de habilitación


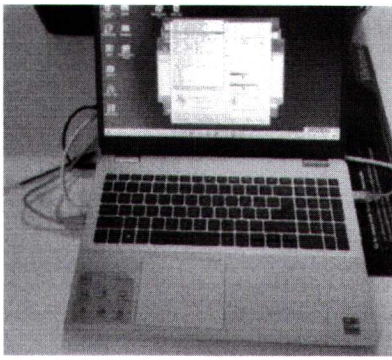

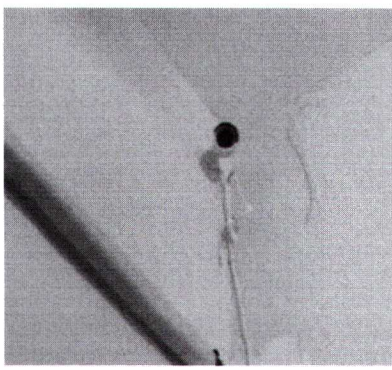
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 11. Evidencia de habilitación CATD 8



PREP

2021 • SIN



Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

2.8.5 Distribución planeada

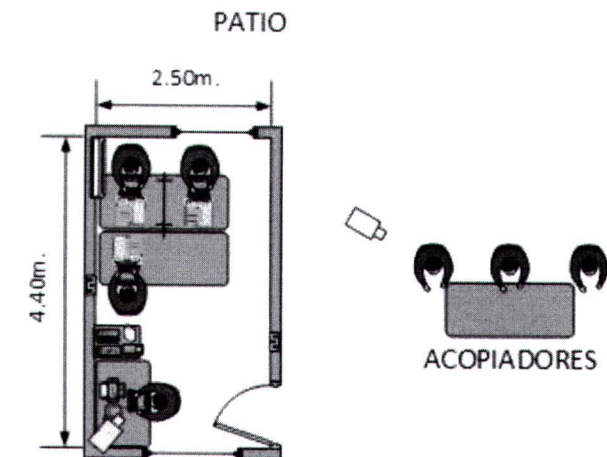


Imagen 16. Distribución CATD 8

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.9 CATD 09 - Salvador Alvarado y Angostura

2.9.1 Dirección

Calle Samuel M. Gil No. 1540 Entre Ignacio Ramírez e Ignacio Triguera Col. Magisterio, C.P. 81470, Salvador Alvarado, Sinaloa.

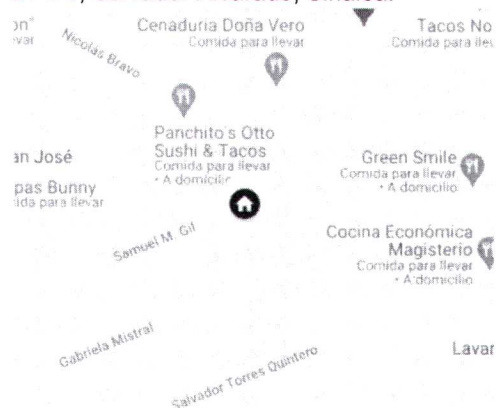


Imagen 17. Ubicación CATD 9

2.9.2 Fecha de habilitación

Se realizó la visita el día 25-abril-2021 por Julio César Vizcarra Guerrero y Alfredo Garibaldi


2.9.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.9.4 Evidencia de habilitación

Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 12. Evidencia de habilitación CATD 9

2.9.5 Distribución planeada

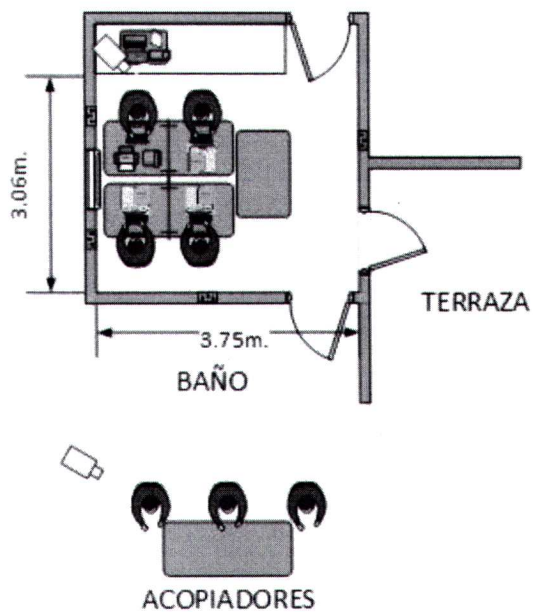

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 18. Distribución CATD 9

2.10 CATD 10 - Mocorito, Badiraguato y Navolato

2.10.1 Dirección

Miguel Hidalgo No. 42 Entre Av. 16 de septiembre y Esq. Mocorito, Loc. Mocorito, C.P. 80800, Mocorito, Sinaloa.

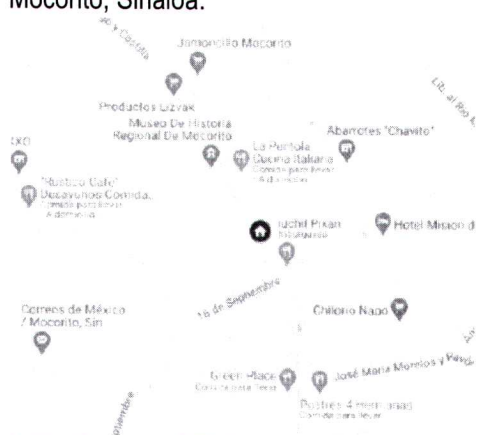


Imagen 19. Ubicación CATD 10

2.10.2 Fecha de habilitación

El día 26-abril-2021, realizó la visita Julio César Vizcarra Guerrero y Alfredo Garibaldi.

2.10.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.10.4 Evidencia de habilitacion




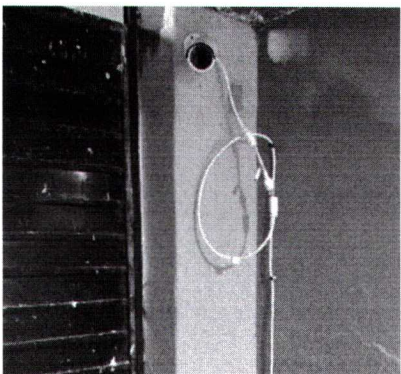
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 13. Evidencia de habilitacion CATD 10

2.10.5 Distribución planeada

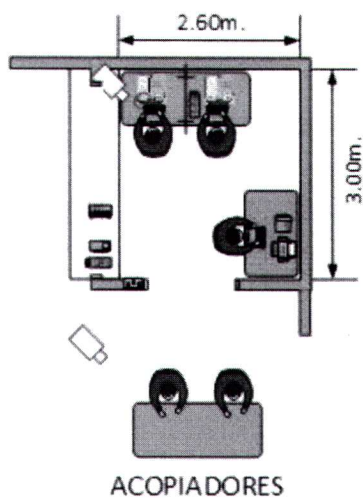


Imagen 20. Distribución CATD 10

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.11 CATD 11 - Navolato

2.11.1 Dirección

Esquina de las Calles Miguel Hidalgo y Ángel Flores Col. Centro, C.P. 84201, Navolato, Sinaloa






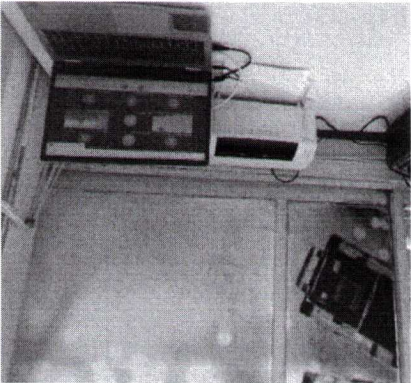
Imagen 21. Ubicación CATD 11

2.11.2 Fecha de habilitación

El día 27-abril-2021 realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza

2.11.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

Tabla 14. Evidencia de habilitación CATD 11

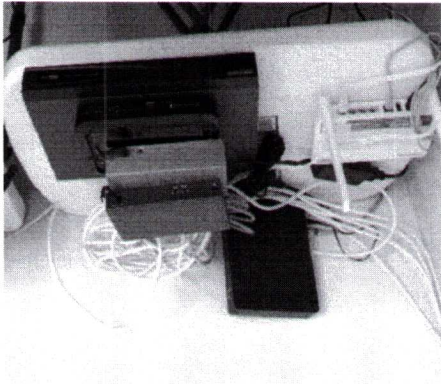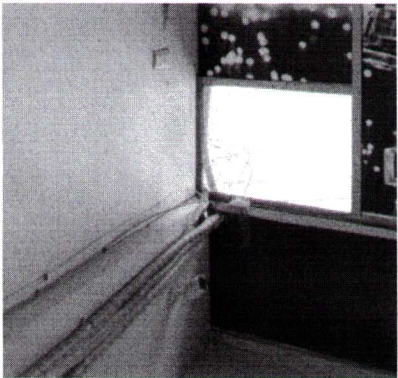	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	
Instalación escáneres:	Instalación de PC:

2.11.4 Evidencia de habilitación

2.11.5 Distribución planeada

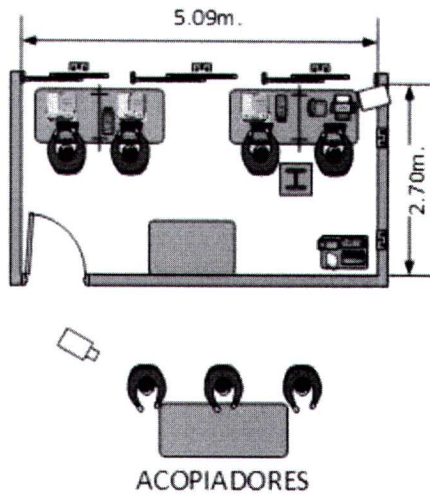


Imagen 22. Distribución CATD 11

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.12 CATD 12 - Culiacán

2.12.1 Dirección

Bldv. Valle Alto y Blvd. de la Búsqueda, No. 4843 Col. Valle Alto, C.P. 80050, Culiacán, Sinaloa

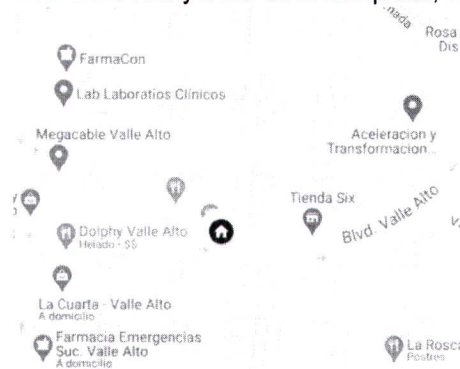


Imagen 23. Ubicación CATD 12

2.12.2 Fecha de habilitación

El día 23-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza

2.12.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.12.4 Evidencia de habilitacion





Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 15. Evidencia de habilitacion CATD 12

2.12.5 Distribución planeada

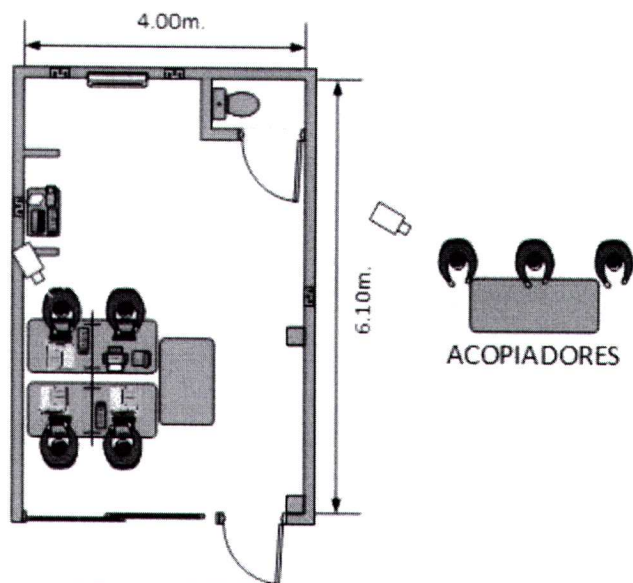


Imagen 24. Distribución CATD 12

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.13 CATD 13 - Culiacán

2.13.1 Dirección

Calle Guamúchil No. 1805 Entre Eucaliptos y Sabinos Col. La Campiña, C.P. 80060, Culiacán, Sinaloa



Imagen 25. Ubicación CATD 13

2.13.2 Fecha de habilitacion

El día 22-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza

2.13.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.13.4 Evidencia de habilitacion



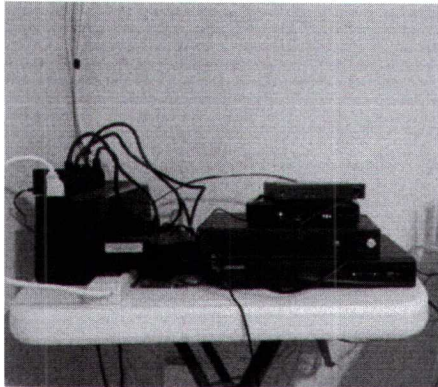
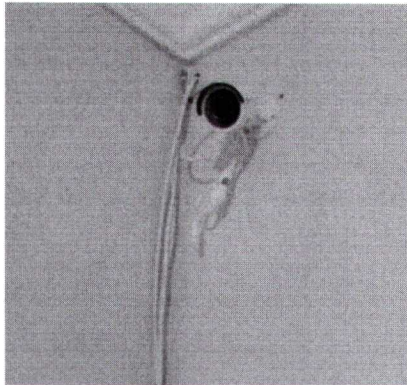
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 16. Evidencia de habilitacion CATD 13

2.13.5 Distribución planeada

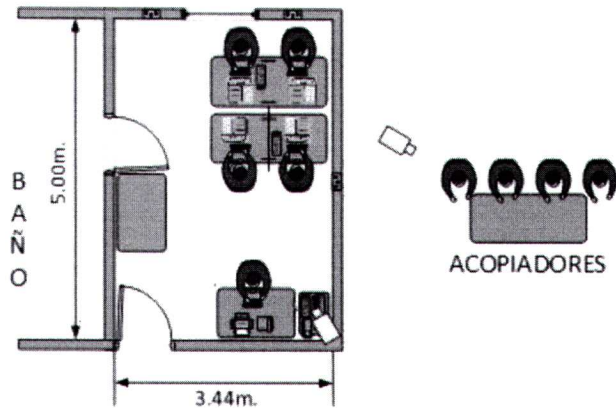


Imagen 26. Distribución CATD 13

Acopiadoras/acopiadores	4
Digitalizadoras/digitalizadores	4
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.14 CATD 14 - Culiacán

2.14.1 Dirección

Avenida Epitacio Osuna No. 1302 Col. Centro, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa

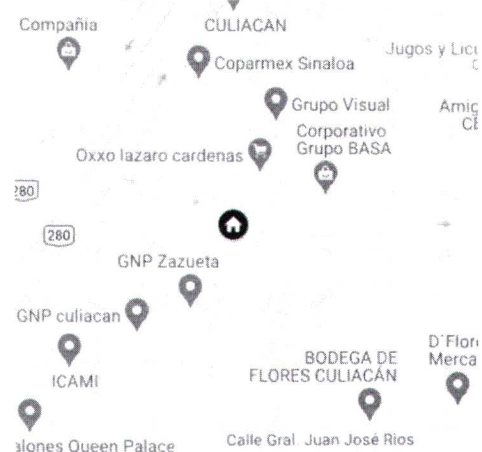


Imagen 27. Ubicación CATD 14

2.14.2 Fecha de habilitación

El día 23-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza

2.14.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.14.4 Evidencia de habilitacion


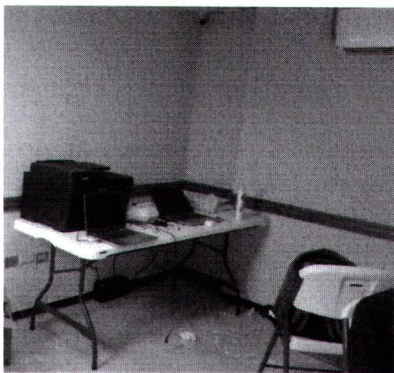
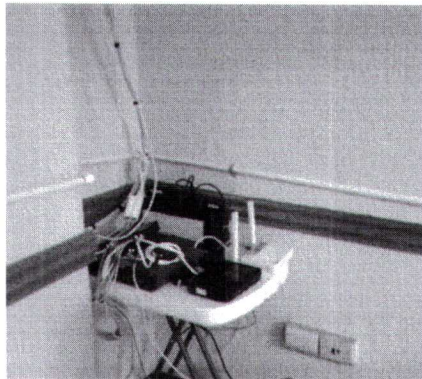
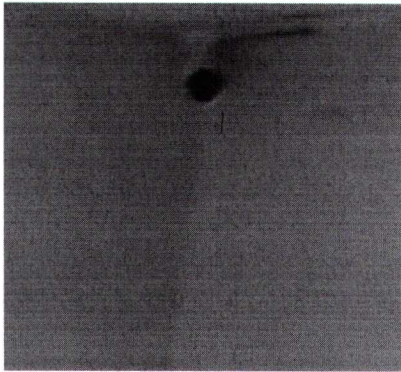
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 17. Evidencia de habilitacion CATD 14

2.14.5 Distribución planeada

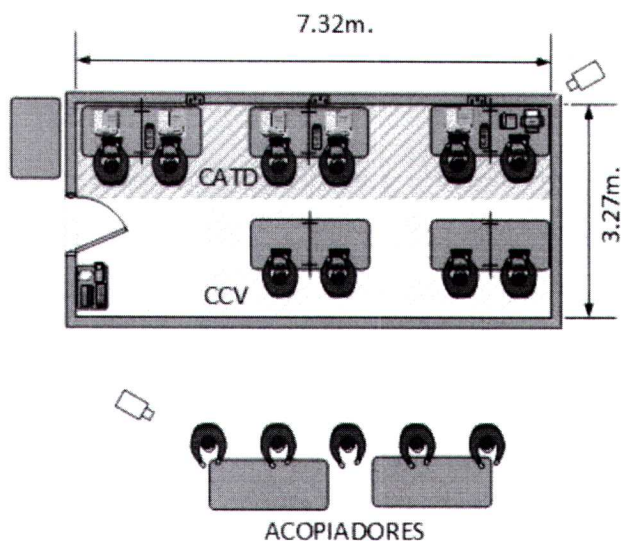


Imagen 28. Distribución CATD 14

Acopiadoras/acopiadores	5
Digitalizadoras/digitalizadores	5
Capturistas	2
Verificadoras/verificadores	2
Coordinadoras/coordinadores	1

2.15 CATD 15 - Culiacán

2.15.1 Dirección

Calle Froilán Cruz Manjarrez Esq. Con Antonio Ancona No. 2000 Local 11 y 12 Col. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa.

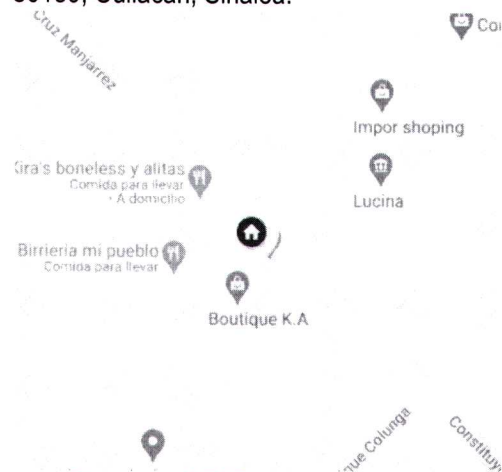


Imagen 29. Ubicación CATD 15

2.15.2 Fecha de habilitación

El día 24-abril-2021, realizó la Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza

2.15.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.15.4 Evidencia de habilitación

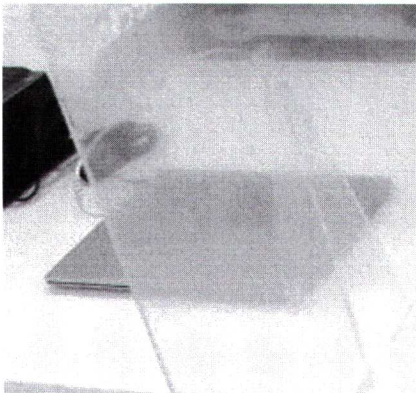
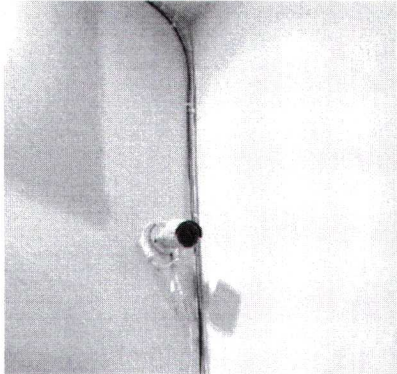
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 18. Evidencia de habilitación CATD 15

2.15.5 Distribución planeada

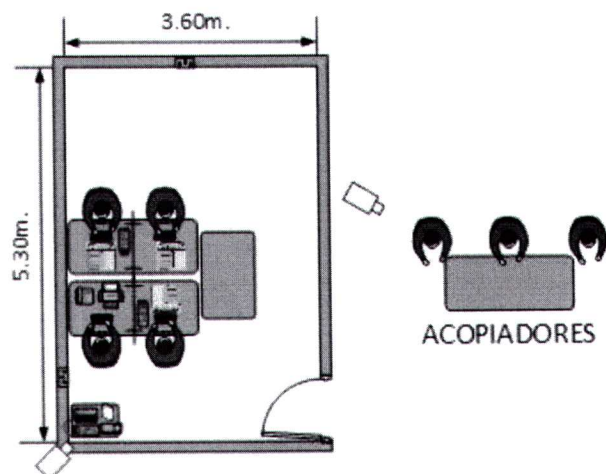


Imagen 30. Distribución CATD 15

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Reporte de habilitación CATD Parte 2

PREP 2021
IEES

Abril 2021

Confidencialidad del Documento

© 2021 Informática Electoral. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento es propiedad de Informática Electoral, cualquier reproducción parcial o total, está estrictamente prohibida si no se hace con el permiso estricto y por escrito de Informática Electoral. Este documento está sujeto a cambios. Cualquier comentario, corrección o pregunta deberán ser dirigidos al autor.
http://informaticaelectoral.com/aviso_de_privacidad.pdf



Informática
Electoral

Contenido

0	Prefacio	6
1	Introducción	7
1.1	Criterios y ponderación para la evaluación de los CATD y CCV	7
2	Inspección previa	9
2.1	CATD 16 - Culiacán	11
2.2	CATD 17 - Culiacán	14
2.3	CATD 18 - Culiacán	17
2.4	CATD 19 - Elota, Cosalá, San Ignacio y Culiacán.....	20
2.5	CATD 20 - Mazatlán	23
2.6	CATD 21 - Mazatlán	26
2.7	CATD 22 - Mazatlán	29
2.8	CATD 23 - Concordia y Mazatlán	32
2.9	CATD 24 - Rosario y Escuinapa	35
2.10	CATD 25 - Municipal Choix.....	38
2.11	CATD 26 - Municipal Angostura.....	41
2.12	CATD 27 - Municipal Navolato.....	44
2.13	CATD 28 - Municipal Badiraguato.....	47
2.14	CATD 29 - Municipal Cósala	50
2.15	CATD 30 - Municipal San Ignacio.....	53
2.16	CATD 31 - Municipal Concordia	56
2.17	CATD 32 - Municipal Escuinapa.....	59

Contenido de tablas

Tabla 1. Criterios de evaluación.....	7
Tabla 2. Tabla de evaluación CATD's.....	10
Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento	10
Tabla 19. Evidencia de habilitacion CATD 16	12
Tabla 20. Evidencia de habilitacion CATD 17	15
Tabla 21. Evidencia de habilitacion CATD 18	18
Tabla 22. Evidencia de habilitacion CATD 19	21
Tabla 23. Evidencia de habilitacion CATD 20	24
Tabla 24. Evidencia de habilitacion CATD 21	27
Tabla 25. Evidencia de habilitacion CATD 22	30
Tabla 26. Evidencia de habilitacion CATD 23	33
Tabla 27. Evidencia de habilitacion CATD 24	36
Tabla 28. Evidencia de habilitacion CATD 25	39
Tabla 29. Evidencia de habilitacion CATD 26	42
Tabla 30. Evidencia de habilitacion CATD 27	45
Tabla 31. Evidencia de habilitacion CATD 28	48
Tabla 32. Evidencia de habilitacion CATD 29	51
Tabla 33. Evidencia de habilitacion CATD 30	54
Tabla 34. Evidencia de habilitacion CATD 31	57
Tabla 35. Evidencia de habilitacion CATD 32	60

Contenido de imágenes

Imagen 31. Ubicación CATD 16.....	11
Imagen 32. Distribución CATD 16.....	13
Imagen 33. Ubicación CATD 17.....	14
Imagen 34. Distribución CATD 17.....	16
Imagen 35. Ubicación CATD 18.....	17
Imagen 36. Distribución CATD 18.....	19
Imagen 37. Ubicación CATD 19.....	20
Imagen 38. Distribución CATD 19.....	22
Imagen 39. Ubicación CATD 20.....	23
Imagen 40. Distribución CATD 20.....	25
Imagen 41. Ubicación CATD 21.....	26
Imagen 42. Distribución CATD 21.....	28
Imagen 43. Ubicación CATD 22.....	29
Imagen 44. Distribución CATD 22.....	31
Imagen 45. Ubicación CATD 23.....	32
Imagen 46. Distribución CATD 23.....	34
Imagen 47. Ubicación CATD 24.....	35
Imagen 48. Distribución CATD 24.....	37
Imagen 49. Ubicación CATD 25.....	38
Imagen 50. Distribución CATD 25.....	40
Imagen 51. Ubicación CATD 26.....	41
Imagen 52. Distribución CATD 26.....	43
Imagen 53. Ubicación CATD 27.....	44
Imagen 54. Distribución CATD 27.....	46
Imagen 55. Ubicación CATD 28.....	47
Imagen 56. Distribución CATD 28.....	49
Imagen 57. Ubicación CATD 29.....	50
Imagen 58. Distribución CATD 29.....	52
Imagen 59. Ubicación CATD 30.....	53
Imagen 60. Distribución CATD 30.....	55
Imagen 61. Ubicación CATD 31.....	56
Imagen 62. Distribución CATD 31.....	58
Imagen 63. Ubicación CATD 32.....	59
Imagen 64. Distribución CATD 32.....	61

Glosario de términos

- a) **CATD:** Centro de Acopio y Transmisión de Datos.
- b) **CCV:** Centro de Captura y Verificación.
- c) **LAN:** Red de Área Local (por sus siglas en inglés).
- d) **OPLE:** Organismo Público Local Electoral
- e) **PREP:** Programa de Resultados Electorales Preliminares.
- f) **PTO:** Proceso Técnico Operativo.
- g) **UPS:** Equipos de energía ininterrumpida.
- h) **IEES:** Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

0 Prefacio

Control de versión y administración del documento:

Es responsabilidad del lector asegurarse de tener la última versión de este documento. Cualquier pregunta acerca del mismo deberá dirigirse al propietario de este documento.

Autor de este documento:

El contacto principal para preguntas y observaciones acerca de este documento es:
Carlos Eugenio González Peiro.
IE®

Confidencialidad:

La información contenida en este documento deberá tratarse como información privada y confidencial. Esta información no deberá divulgarse a otras personas que no estén involucradas en el proyecto **PREP 2021 - IEES**.

Historia de cambios en el documento:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Febrero 2018	1.0	Generación de documento	Omar Alonso Zazueta Bustamante
Abril 2021	1.1	Integración de conceptos	Carlos Eugenio González Peiro

Firmas de autorización:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sergio Manuel Aréchiga Aguilar Coordinador de TI	Carlos Eugenio González Peiro Administrador de proyecto	Jorge Omar Padilla Tizoc Director de Proyecto

1 Introducción

Este reporte tiene como objetivo proporcionar la información acerca de la habilitación de los inmuebles que se utilizarán como Centros de Acopio y Transmisión de Datos, como lo marca el capítulo VII del Anexo 13 (lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP), con la finalidad de garantizar que se cubran las especificaciones marcadas en dicho anexo para la correcta operación ininterrumpida de PREP.

- I. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para que los integrantes de los consejos locales, distritales y municipales, según corresponda, puedan acceder a supervisar su operación sin obstaculizar el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del Proceso Técnico Operativo (PTO).
- II. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada iluminación y ventilación, así como con el mobiliario suficiente para la operación. De la misma manera, deberá acondicionarse de tal forma que garantice la integridad y seguridad del personal, equipos, materiales e información.

Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATD dependerán del número de personas que participen en el desarrollo de las fases del PTO, considerando suficiente espacio para realizar todas las actividades del proceso de manera ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del personal y el equipo del CATD.

1.1 Criterios y ponderación para la evaluación de los CATD y CCV

Descripción	Rango de puntaje	Porcentaje máximo
Seguridad física	0 - 4	40 %
Espacio para personal	0 - 2	30 %
Climatizado	0 - 2	10 %
Cantidad de contactos	0 - 3	10 %
Iluminación	0 - 2	10 %

Tabla 1. Criterios de evaluación

1.1.1 Seguridad física

- Área cerrada o delimitada (valor 1 punto)
- Ventas con protección (valor 1 punto)
- Puerta de acceso (valor 1 punto)
- Chapa o candado para resguardar el área (valor 1 punto)

1.1.2 Espacio para personal

- El personal y los equipos pueden ser ubicados en el área asignada (valor 1 punto)
- Es posible la libre movilidad dentro del área (valor 1 punto)

1.1.3 Climatizado

- No (valor 0 punto)
- Comparte el a/c de otra área o cuenta con ventilador de techo (valor 1 punto)
- Sí (valor 1 punto)

1.1.4 Cantidad de contactos

- Escribir cantidad de contactos en el área (valor 1 punto)

NOTA: se contabilizan la cantidad de contactos en el área PREP asignada, a partir de 3 contactos solamente se escribe 3 puntos.

1.1.5 Iluminación

- No tiene
- Cuenta con iluminación artificial, aunque sea compartida con otras áreas (valor 1 punto)
- Posee iluminación natural mediante ventanas (valor 1 punto)

2 Inspección previa

Durante el periodo del martes 23/02/21 al miércoles 03/03/21, el equipo de supervisión técnica realizó una visita previa a los inmuebles que el OPLE asignó como CATD, para verificar si cumplen con los requerimientos mínimos establecidos para el correcto funcionamiento de la infraestructura técnica del CATD para el proceso PREP 2021.

Los agentes de soporte técnico realizaron un listado de actividades para supervisión del inmueble, generando el presente reporte, el cual contiene la aprobación o rechazo de los inmuebles, así como también la solicitud de modificaciones a la infraestructura.

Del recorrido de inspección de los CATD se generaron las siguientes observaciones:

ID CATD	Municipio	Evaluación					
		Seguridad	Espacio	Clima	Contactos	Iluminación	Total
1	El Fuerte	20%	30%	0%	0%	10%	60%
2	Los Mochis	40%	30%	0%	10%	10%	90%
3	Los Mochis	40%	15%	5%	10%	10%	80%
4	Los Mochis	10%	30%	0%	6%	10%	56.66%
5	Los Mochis	40%	30%	0%	10%	10%	90%
6	Sinaloa de Leyva	10%	15%	5%	10%	5%	45%
7	Guasave	10%	15%	5%	10%	5%	45%
8	Guasave	40%	15%	10%	6%	10%	81.66%
9	Guamúchil	40%	15%	10%	10%	10%	85%
10	Mocorito	20%	15%	5%	3%	5%	48.33%
11	Navolato	40%	30%	5%	10%	5%	90%
12	Culiacán	40%	30%	10%	10%	10%	100%
13	Culiacán	40%	30%	5%	10%	5%	90%
14	Culiacán	40%	30%	0%	10%	5%	85%
15	Culiacán	30%	30%	0%	6%	5%	71.66%
16	Culiacán	30%	30%	10%	10%	10%	90%
17	Culiacán	20%	30%	5%	3%	5%	63.33%
18	Culiacán	10%	30%	0%	6%	10%	56.66%
19	La Cruz	10%	30%	5%	6%	5%	56.66%
20	Mazatlán	10%	15%	5%	3%	5%	38.33%

21	Mazatlán	10%	15%	5%	3%	5%	38.33%
22	Mazatlán	10%	15%	5%	10%	5%	45%
23	Mazatlán	40%	30%	5%	6%	5%	86.66%
24	El Rosario	30%	15%	0%	0%	5%	50%
25	Choix	40%	30%	5%	6%	10%	91.66%
26	Angostura	40%	30%	5%	6%	10%	91.66%
27	Navolato	40%	30%	0%	3%	5%	78.33%
28	Badiraguato	40%	30%	0%	10%	5%	85%
29	Cosalá	40%	30%	5%	10%	10%	95%
30	San Ignacio	0%	15%	5%	3%	5%	28.33%
31	Concordia	30%	30%	0%	10%	5%	75%
32	Escuinapa	30%	30%	10%	3%	10%	86.66%
Total		28%	25%	4%	7%	7%	71%

Tabla 2. Tabla de evaluación CATD's

Resultado de inspección	Cantidad de CATD	Porcentaje de cumplimiento
CATD con cumplimiento óptimo (mayor 70%)	19	70.92%
CATD "No aprobados"	13	29.08%

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento

2.16 CATD 16 - Culiacán

2.16.1 Dirección

Lisboa No. 5107 Entre Varsovia y Roma Fracc. Balcones del Valle, C.P. 80184, Culiacán, Sinaloa

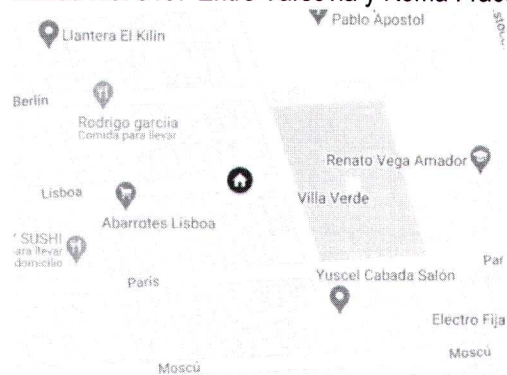


Imagen 1. Ubicación CATD 16

2.16.2 Fecha de habilitacion

Se realizó la visita el día 25-abril-2021 por Julio César Vizcarra Guerrero y Alfredo Garibaldi.

2.16.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.16.4 Evidencia de habilitación


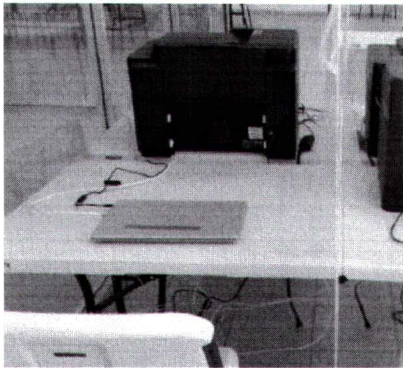
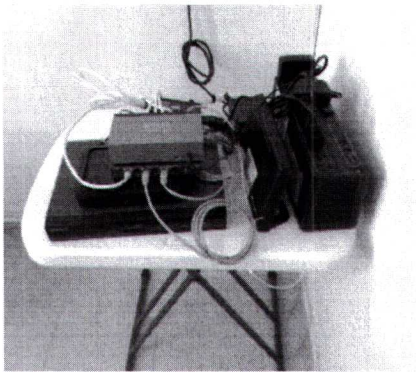
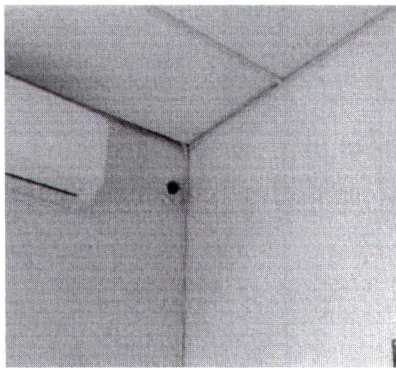
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 4. Evidencia de habilitación CATD 16

2.16.5 Distribución planeada

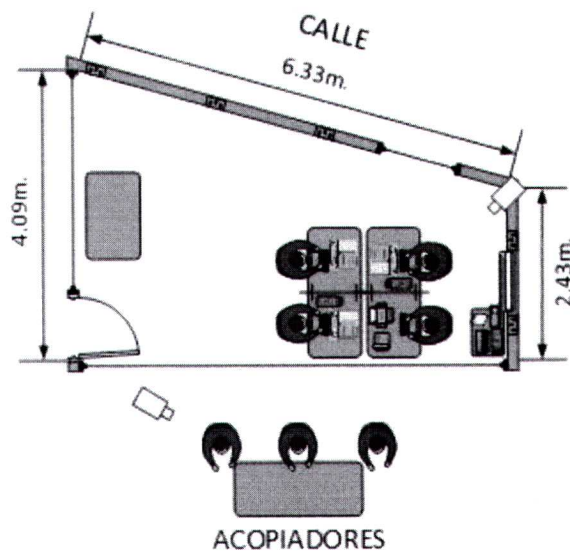


Imagen 2. Distribución CATD 16

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.17 CATD 17 - Culiacán

2.17.1 Dirección

Avenida Patria No. 2244-B entre Presidente Carlos Chávez y Silvestre Revueltas Col. Las Huertas.
C.P. 80290, Culiacán, Sinaloa.



Imagen 3. Ubicación CATD 17

2.17.2 Fecha de habilitación

23-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza.

2.17.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.17.4 Evidencia de habilitacion




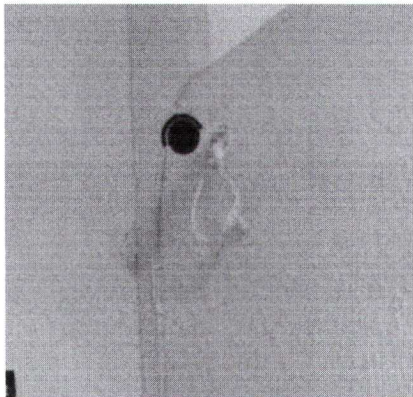
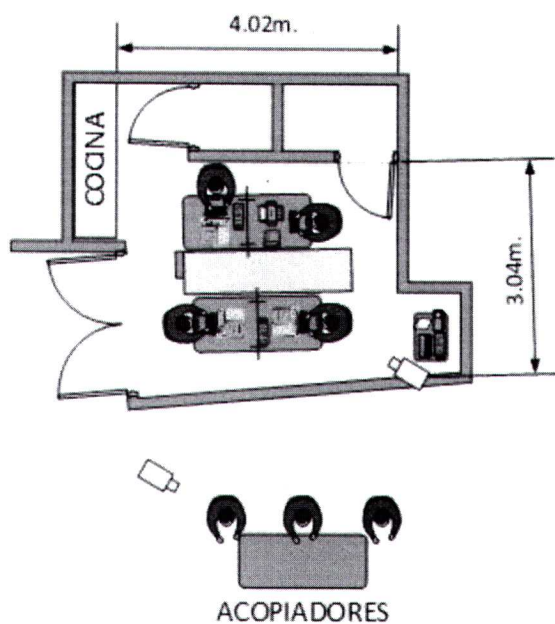
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 5. Evidencia de habilitacion CATD 17

2.17.5 Distribución planeada



Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 4. Distribución CATD 17

2.18 CATD 18 - Culiacán

2.18.1 Dirección

Calle Escobedo No. 946 Ote. Col. Las Vegas, C.P. 80090, Culiacán, Sinaloa

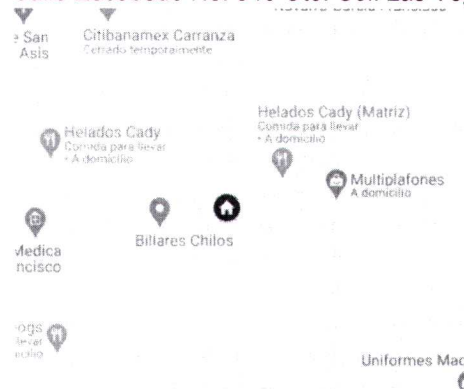


Imagen 5. Ubicación CATD 18

2.18.2 Fecha de habilitacion

19-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza.

2.18.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.18.4 Evidencia de habilitacion



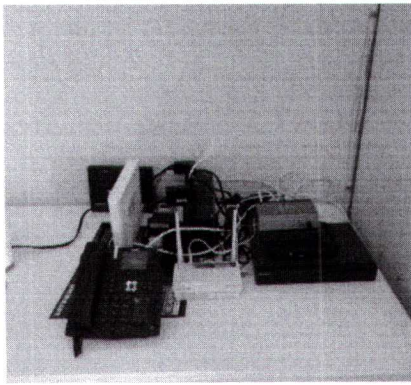
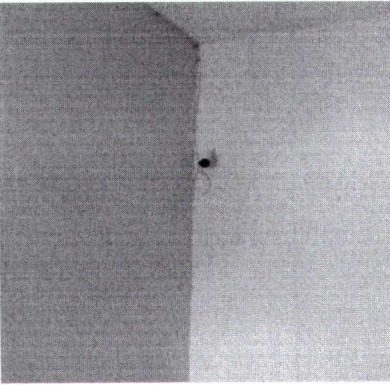
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 6. Evidencia de habilitacion CATD 18

2.18.5 Distribución planeada

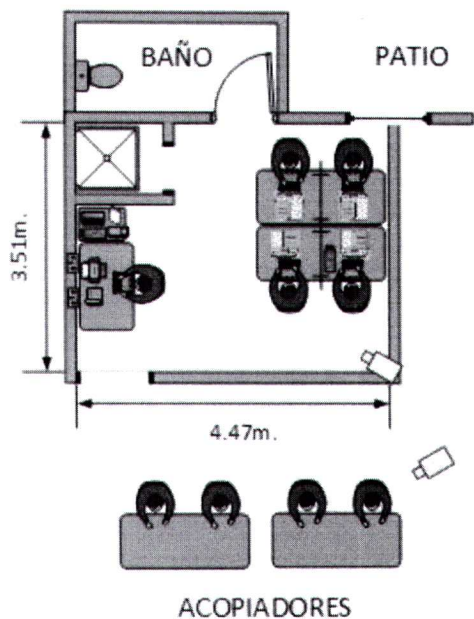


Imagen 6. Distribución CATD 18

Acopiadoras/acopiadores	4
Digitalizadoras/digitalizadores	4
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.19 CATD 19 - Elota, Cosalá, San Ignacio y Culiacán

2.19.1 Dirección

Ave. Gabriel Leyva Solano Esq. Con Mariano Matamoros Col. Centro, C.P. 82765, La Cruz, Sinaloa



Imagen 7. Ubicación CATD 19

2.19.2 Fecha de habilitacion

El día 26-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.19.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.19.4 Evidencia de habilitacion


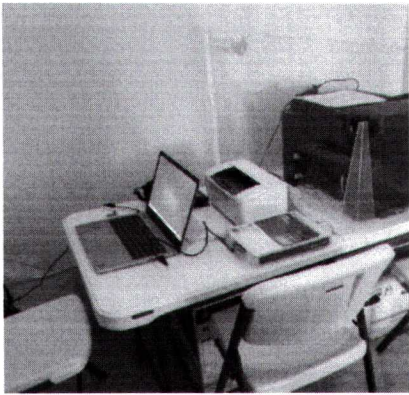
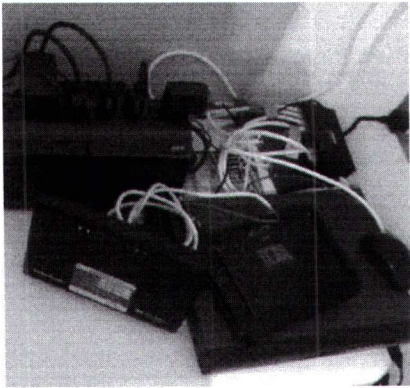
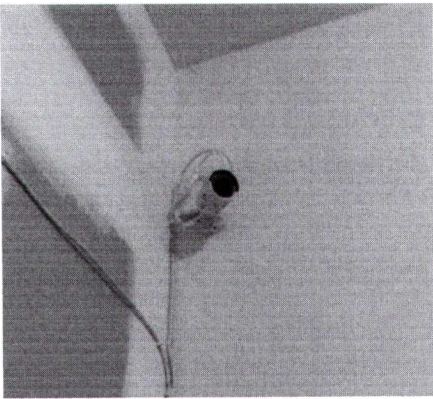
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 7. Evidencia de habilitacion CATD 19

2.19.5 Distribución planeada

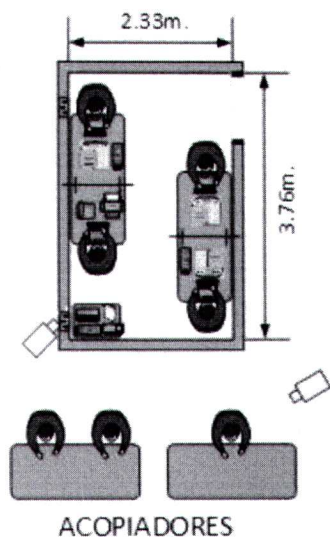


Imagen 8. Distribución CATD 19

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.20 CATD 20 - Mazatlán

2.20.1 Dirección

Libramiento Oscar Pérez Escoboza No. 2023 Col. Jaripillo, C.P. 82136, Mazatlán, Sinaloa

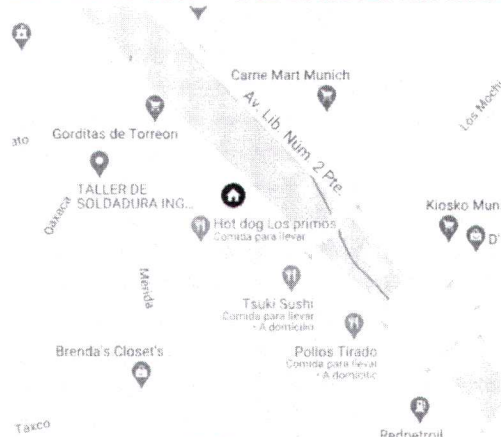


Imagen 9. Ubicación CATD 20

2.20.2 Fecha de habilitación

El día 28-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.20.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.20.4 Evidencia de habilitación


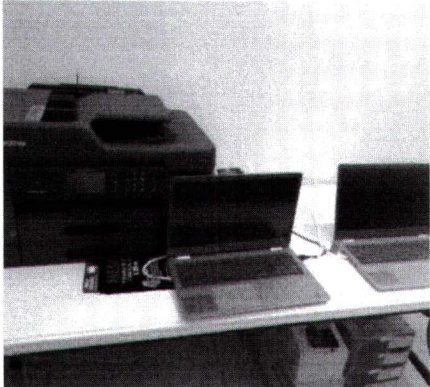
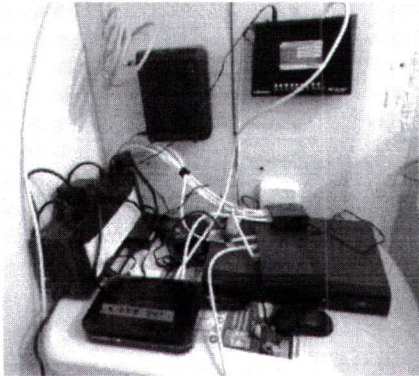
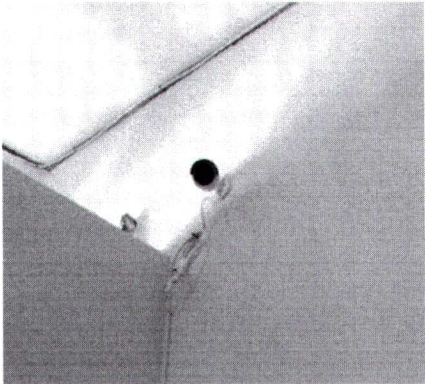

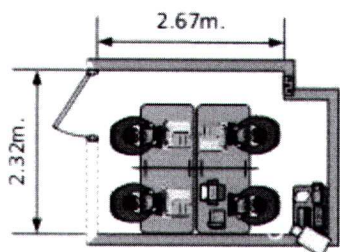
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 8. Evidencia de habilitación CATD 20

2.20.5 Distribución planeada



ACOPIADORES

Imagen 10. Distribución CATD 20

Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.21 CATD 21 - Mazatlán

2.21.1 Dirección

Ave. De la Marina No. 1003 Loc. 5 y 6 Esquina con Zacatecas, Col. Sánchez Célis, C.P. 82120, Mazatlán, Sinaloa.



Imagen 11. Ubicación CATD 21

2.21.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.21.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.21.4 Evidencia de habilitación





Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 9. Evidencia de habilitación CATD 21

2.21.5 Distribución planeada

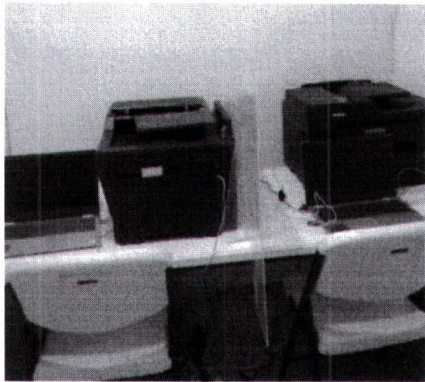



Imagen 12. Distribución CATD 21

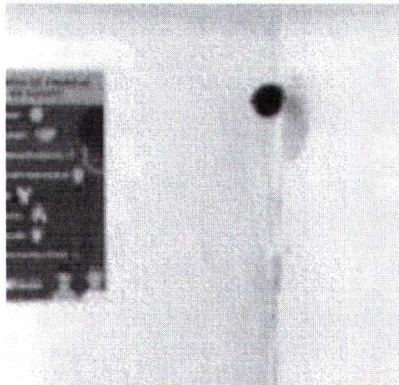Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.22 CATD 22 - Mazatlán

2.22.1 Dirección

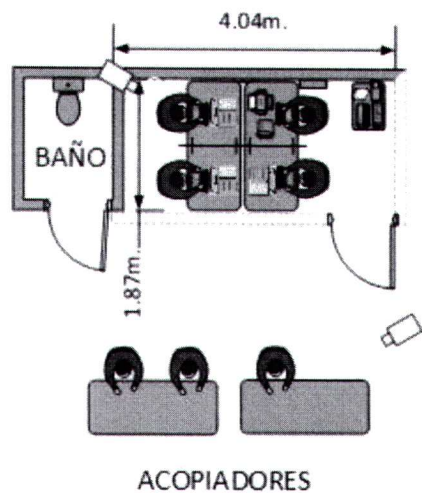Calle Nuevo León No. 1102 Locales 3 y 4, Colonia Shimizu, C.P. 82035, Mazatlán, Sinaloa

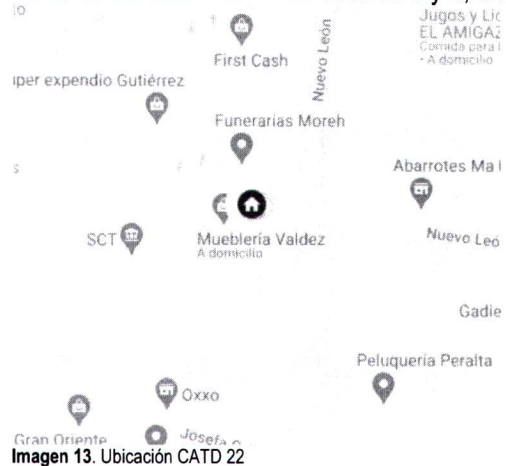

2.22.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.22.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.22.4 Evidencia de habilitación


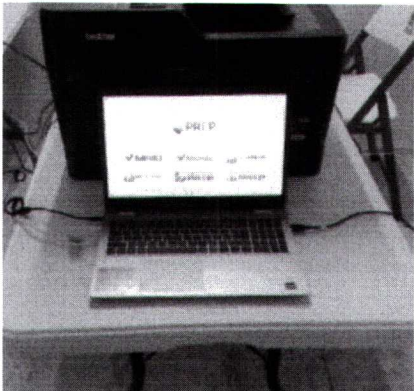
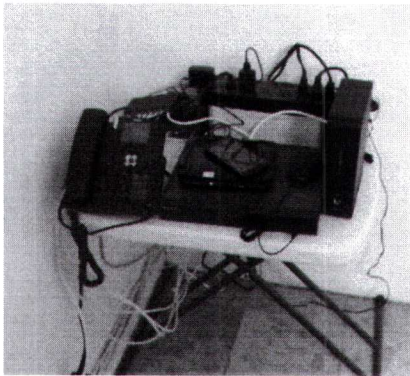
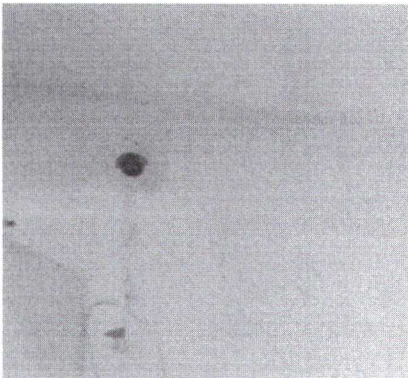
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 10. Evidencia de habilitación CATD 22

2.22.5 Distribución planeada

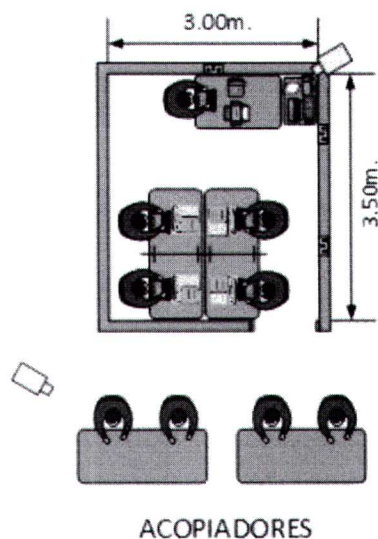


Imagen 14. Distribución CATD 22

Acopiadoras/acopiadores	4
Digitalizadoras/digitalizadores	4
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.23 CATD 23 - Concordia y Mazatlán

2.23.1 Dirección

Calle Nuevo León No. 1102 Locales 1 y 2, Colonia Shimizu, C.P. 82035, Mazatlán, Sinaloa

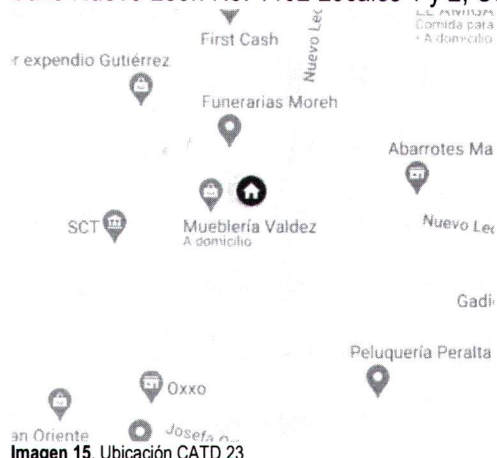


Imagen 15. Ubicación CATD 23

2.23.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.23.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.23.4 Evidencia de habilitación


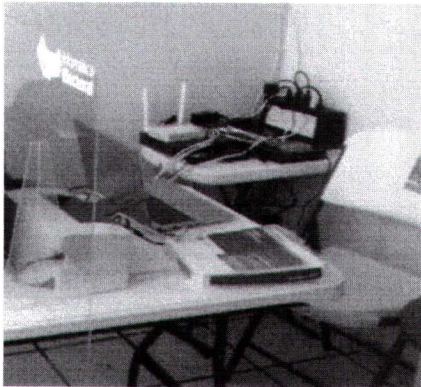
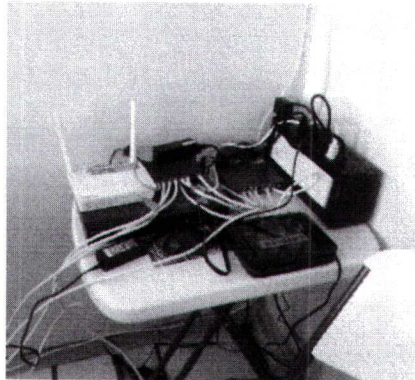
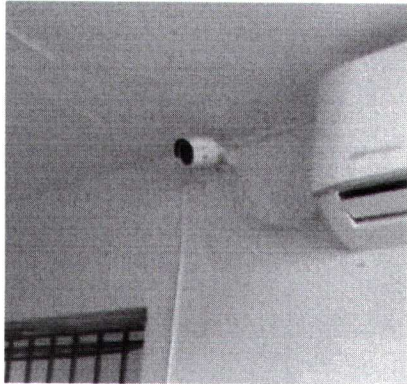
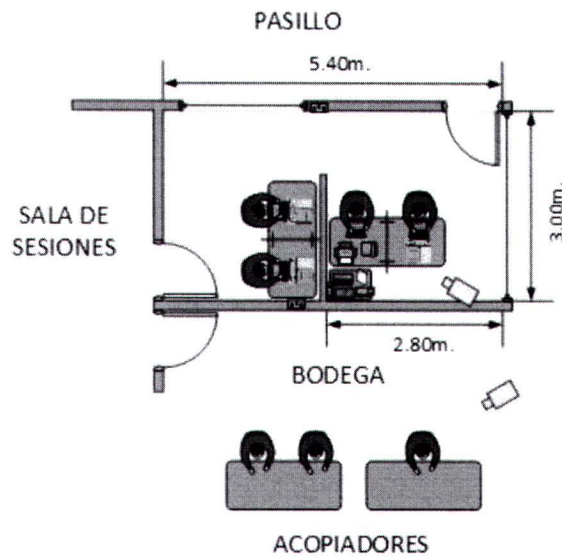
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 11. Evidencia de habilitación CATD 23

2.23.5 Distribución planeada



Acopiadoras/acopiadores	3
Digitalizadoras/digitalizadores	3
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

Imagen 16. Distribución CATD 23

2.24 CATD 24 - Rosario y Escuinapa

2.24.1 Dirección

Calle Rafael Buelna No. 37 Entre Colima y Melchor Ocampo, C.P. 82800, El Rosario, Sinaloa

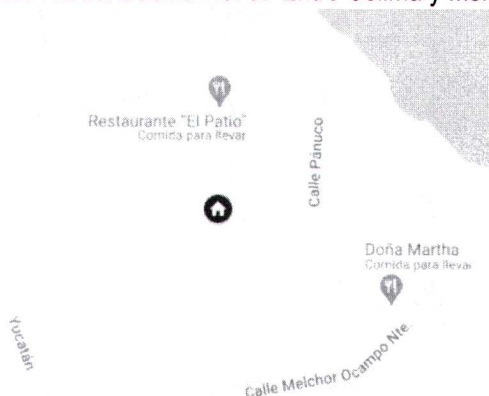


Imagen 17. Ubicación CATD 24

2.24.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.24.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.24.4 Evidencia de habilitación


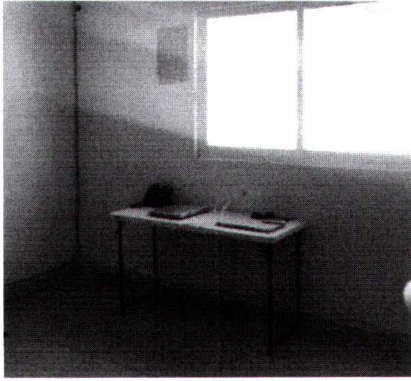
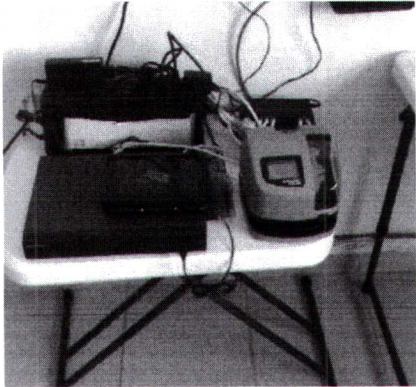
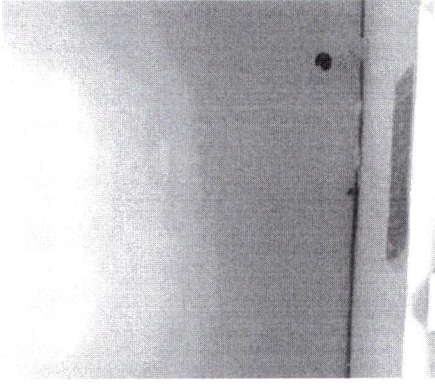

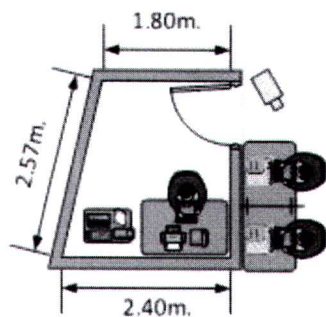
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 12. Evidencia de habilitación CATD 24

2.24.5 Distribución planeada



ACOPIADORES

Imagen 18. Distribución CATD 24

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.25 CATD 25 - Municipal Choix

2.25.1 Dirección

Calle Constitución S/N Poste No. 102-A Entre Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, Col. Juárez, C.P. 81700, Choix, Sinaloa



Imagen 19. Ubicación CATD 25

2.25.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021 realizó la visita Eduardo Valencia Benítez, Jesús Emilio Vega y Jaime de Jesús Domínguez

2.25.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.25.4 Evidencia de habilitacion







Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 13. Evidencia de habilitacion CATD 25

2.25.5 Distribución planeada

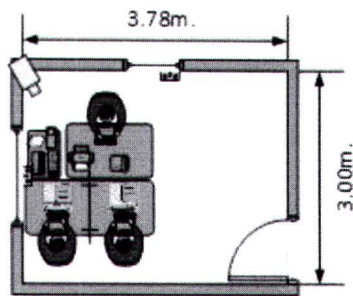

ACOPIADORES

Imagen 20. Distribución CATD 25

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.26 CATD 26 - Municipal Angostura

2.26.1 Dirección

Calle Gabriel Leyva Entre 5 de mayo y Elías Mascareño, C.P. 81600, Angostura, Sinaloa

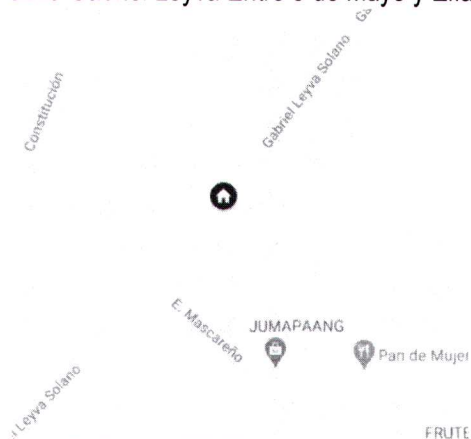


Imagen 21. Ubicación CATD 26

2.26.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Julio César Vizcarra Guerrero y Alfredo Garibaldi

2.26.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.26.4 Evidencia de habilitacion




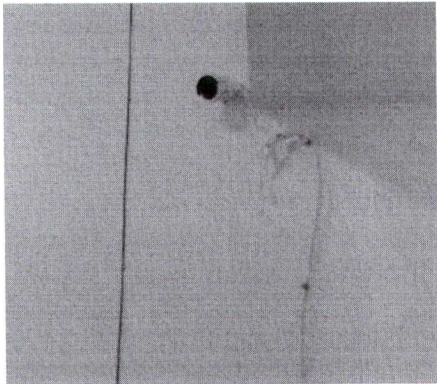
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 14. Evidencia de habilitacion CATD 26

2.26.5 Distribución planeada

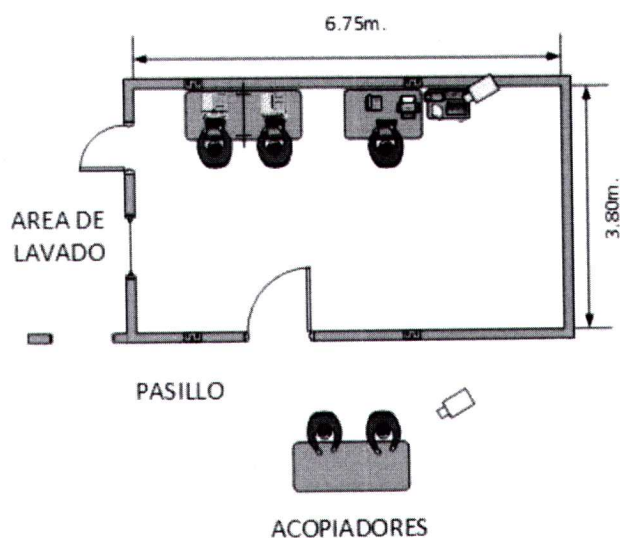


Imagen 22. Distribución CATD 26

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.27 CATD 27 - Municipal Navolato

2.27.1 Dirección

Calle Jesús Almada No. 343 Entre Cuauhtémoc y Sinaloa, C.P. 80349, Navolato, Sinaloa

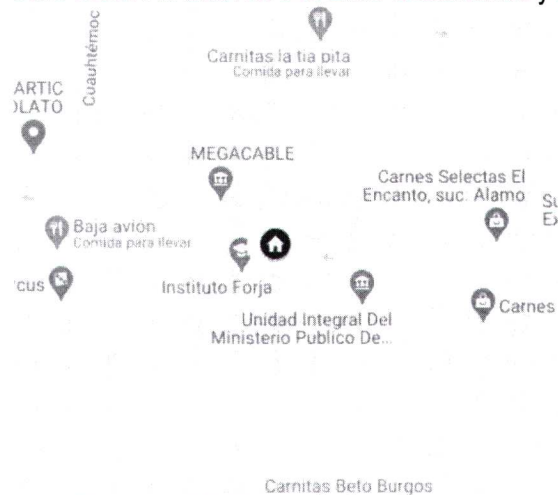


Imagen 23. Ubicación CATD 27

2.27.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza.

2.27.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.27.4 Evidencia de habilitación


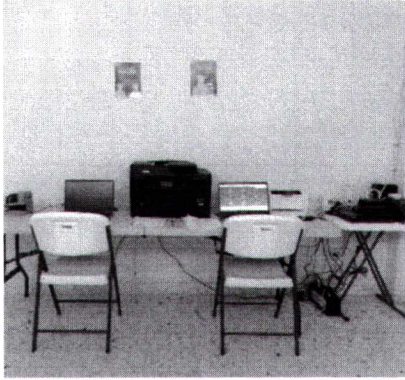


Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 15. Evidencia de habilitación CATD 27

2.27.5 Distribución planeada

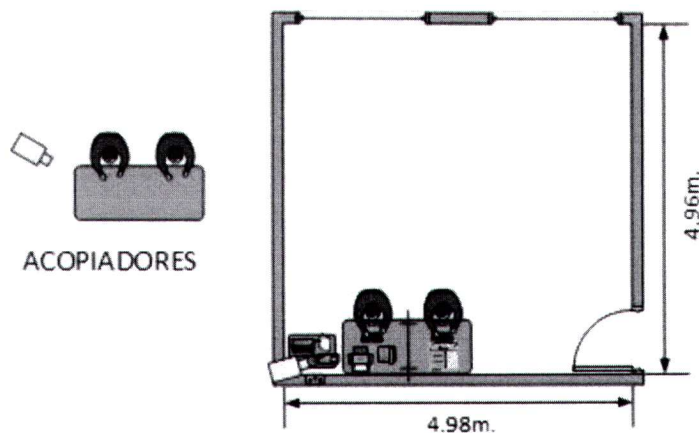


Imagen 24. Distribución CATD 27

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.28 CATD 28 - Municipal Badiraguato

2.28.1 Dirección

Calle Teófilo Álvarez Borbona S/N Plaza Cherardos Col. Centro, C.P. 80500, Badiraguato, Sinaloa



Imagen 25. Ubicación CATD 28

2.28.2 Fecha de habilitación

El día 19-abril-2021, realizó la visita Marcos Francisco Pineda Simons y Manuel Iván Rubio Espinoza.

2.28.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.28.4 Evidencia de habilitación


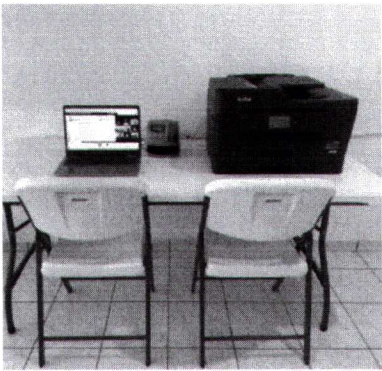

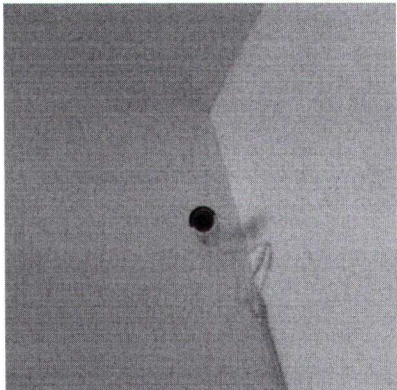
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 16. Evidencia de habilitación CATD 28

2.28.5 Distribución planeada

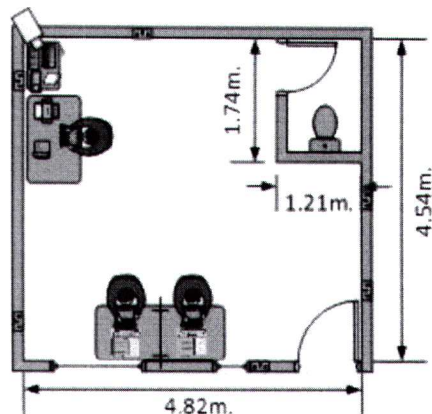


Imagen 26. Distribución CATD 28

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.29 CATD 29 - Municipal Cósala

2.29.1 Dirección

Carretera a la México 15 Calle Constitución S/N Col. La Canela, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa



Imagen 27. Ubicación CATD 29

2.29.2 Fecha de habilitación

El día 20-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.29.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.29.4 Evidencia de habilitacion





Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 17. Evidencia de habilitacion CATD 29

2.29.5 Distribución planeada

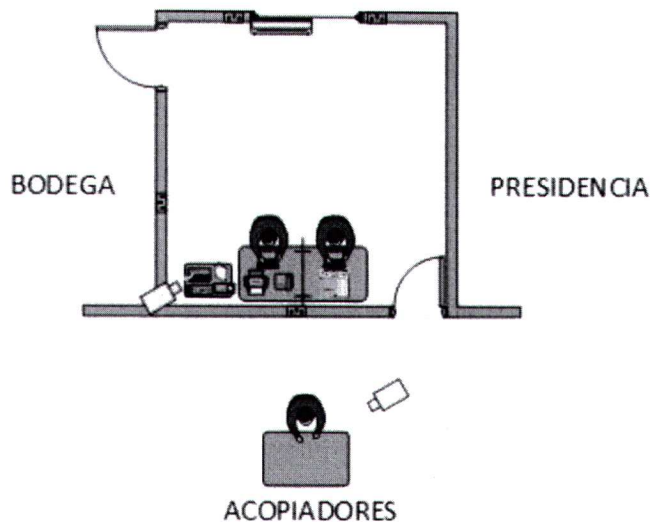


Imagen 28. Distribución CATD 29

Acopiadoras/acopiadores	1
Digitalizadoras/digitalizadores	1
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.30 CATD 30 - Municipal San Ignacio

2.30.1 Dirección

Calle Benito Juárez No. 49 Lote 26 Col. Centro, C.P. 82900, San Ignacio, Sinaloa

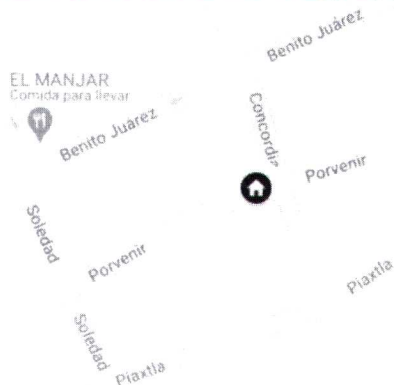


Imagen 29. Ubicación CATD 30

2.30.2 Fecha de habilitación

El día 22-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.30.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.30.4 Evidencia de habilitación


Instalación escáneres:	Instalación de PC:
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 18. Evidencia de habilitación CATD 30

2.30.5 Distribución planeada

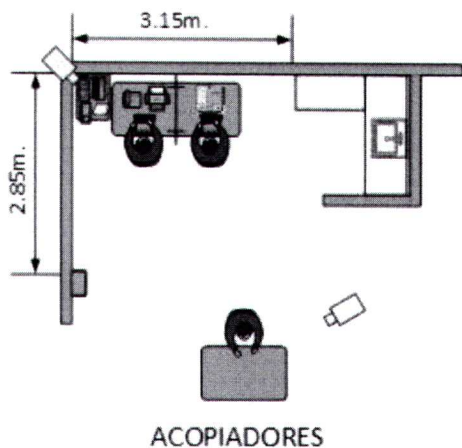


Imagen 30. Distribución CATD 30

Acopiadoras/acopiadores	1
Digitalizadoras/digitalizadores	1
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.31 CATD 31 - Municipal Concordia

2.31.1 Dirección

Calle Ángel Flores Entre Morelos e Hidalgo, C.P. 82600, Concordia, Sinaloa

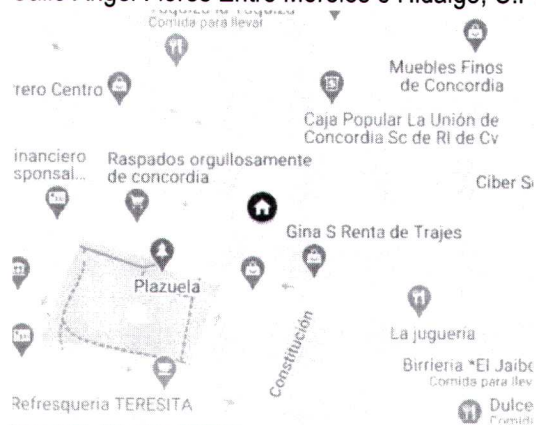


Imagen 31. Ubicación CATD 31

2.31.2 Fecha de habilitación

El día 20-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.31.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.31.4 Evidencia de habilitacion


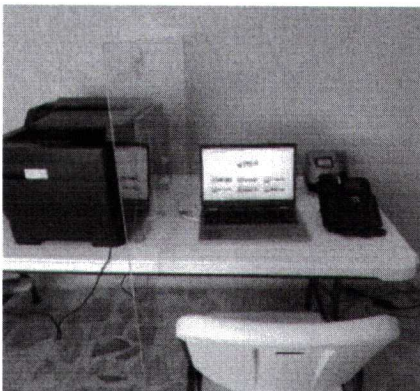
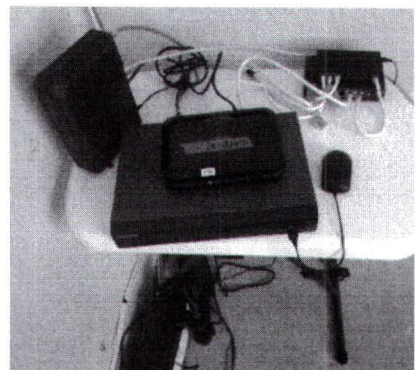
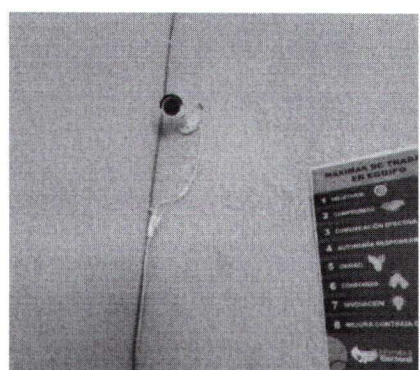
Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 19. Evidencia de habilitacion CATD 31

2.31.5 Distribución planeada

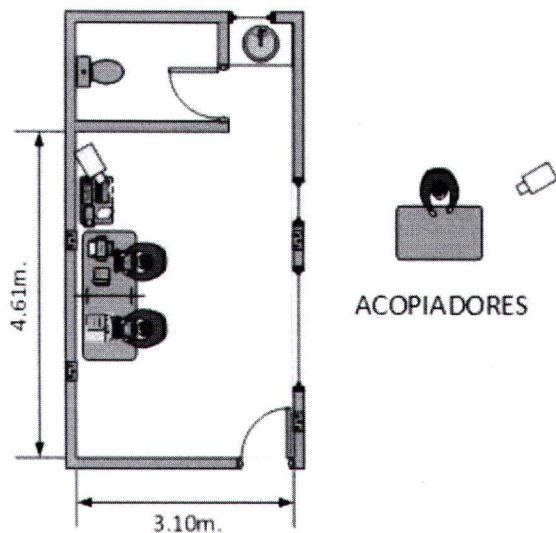


Imagen 32. Distribución CATD 31

Acopiadoras/acopiadores	1
Digitalizadoras/digitalizadores	1
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1

2.32 CATD 32 - Municipal Escuinapa

2.32.1 Dirección

Callejón Centenario Entre Veracruz y Centenario, C.P. 82400, Escuinapa, Sinaloa



Imagen 33. Ubicación CATD 32

2.32.2 Fecha de habilitacion

El día 19-abril-2021, realizó la visita Genaro Eduardo Lizárraga Loreto, Gabriel Cruz, Mario Vega Rueda y Luis Rendon.

2.32.3 Evidencia de adecuaciones realizadas

2.32.4 Evidencia de habilitacion

Instalación escáneres:	Instalación de PC:
	
Instalación mesa de telecomunicaciones:	Instalación cámara:
	

Tabla 20. Evidencia de habilitacion CATD 32

2.32.5 Distribución planeada

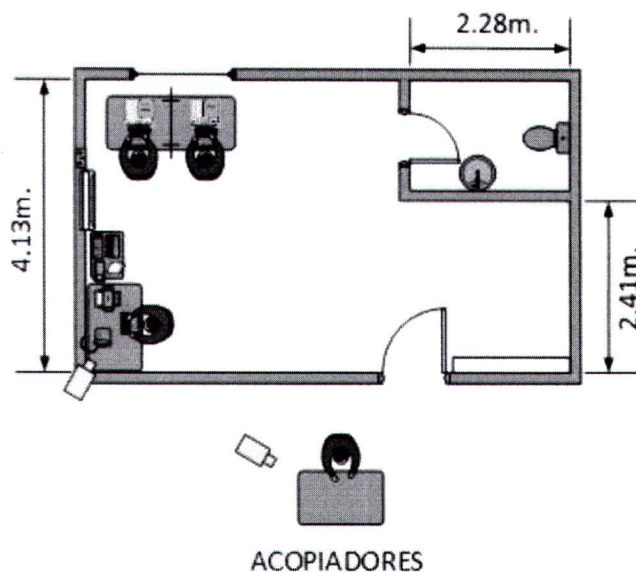


Imagen 34. Distribución CATD 32

Acopiadoras/acopiadores	2
Digitalizadoras/digitalizadores	2
Capturistas	0
Verificadoras/verificadores	0
Coordinadoras/coordinadores	1
